

# Execução Financeira do Fundo de Coesão II

Ponto de situação  
reportado a  
31 de Dezembro



INSTITUTO FINANCEIRO  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL, IP





## ÍNDICE

Breve Enquadramento .....	3
Estrutura .....	3
Destaques .....	4
Glossário de Termos .....	6
1. Uma Visão Global .....	8
Quadro 1. Despesa Certificada e Transferências da Comissão Europeia ....	8
Quadro 2. Despesa Validada e Pagamentos ao Executor.....	8
Decisões Aprovadas e Despesa Validada.....	9
Gráfico 1. Total de Aprovações FC II por Sector .....	9
Gráfico 2. Despesa FC II Validada e por Validar .....	9
Fluxos Financeiros e Execução até 31-12-2009 .....	10
Gráfico 3. Total FC II.....	10
Gráfico 4. Transportes e Ambiente .....	10
Gráfico 5. Assistência Técnica .....	10
Estado de Realização das Decisões .....	11
Gráfico 6. Número Total de Decisões por Sector.....	11
Gráfico 7. Número Total de Decisões por Estado .....	11
Gráfico 8. Número Total de Decisões dos Transportes por Estado .....	11
Gráfico 9. Número Total de Decisões do Ambiente por Estado.....	11
Quadro 3. Número de Decisões e Projectos por Estado .....	12
Quadro 3A. Despesa Validada, Pedidos de Pagamento à CE, Despesa Certificada e Transferências da CE por Estado.....	12
2. EXECUÇÃO FINANCEIRA POR DECISÃO .....	13
Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE.....	13
Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores .....	18
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO .....	22
Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas .....	22
Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa .....	26
4. QUADROS SÍNTESE .....	29
Quadro 8. Número de Executores, Decisões de Aprovação e Montantes Aprovados por Sub-sectores .....	29
Quadro 9. Evolução anual da Despesa Certificada e Transferências Financeiras.....	29
Quadro 10. Despesa Validada e a Validar .....	29



## BREVE ENQUADRAMENTO

A elaboração dos pontos de situação trimestrais designados por “Execução Financeira do Fundo de Coesão II”, iniciada em Março de 2008, manteve em 2009 a função de apoio à decisão num contexto de progressivo encerramento das decisões aprovadas até ao final de 2006.

Uma vez que as diferentes fases em que as decisões se encontram determinam os problemas que as afectam e as medidas a adoptar na análise dos resultados obtidos e ritmos de execução são considerados os seguintes estados:

- Decisões encerradas com saldo pago ou a aguardar pagamento;
- Decisões em execução com ou sem pedido de reprogramação.

Além dos quadros com informação financeira ao nível da decisão, são apresentados quadros síntese por sector e subsector.

No sector do ambiente a maioria das decisões incluem numerosos projectos (Quadro 3) o que aumenta, naturalmente, o grau de complexidade da execução e acompanhamento das mesmas.

No que se refere às decisões encerradas deve ter-se em conta que os dados de execução apresentados em anteriores pontos de situação podem ser alterados se na instrução do pedido de saldo ou mesmo após a sua satisfação forem aplicadas correcções financeiras à despesa validada e certificada, com devolução de pagamentos efectuados quando já tiver sido satisfeito o pedido de saldo.

## ESTRUTURA

O presente documento mantém a estrutura dos anteriores de acordo com os seguintes temas:

- Valores globais por sector e subsector e por estado das decisões:
  - Fluxos financeiros com a CE por sector – Despesa certificada, Pedidos de pagamento à Comissão Europeia e Transferências da CE (Quadro 1 e Gráficos 3 a 5);
  - Execução por sector – Despesa validada e Pagamentos aos Executores (Quadro 2 e Gráficos 2 a 5);
  - Número de Decisões e de projectos por estado e por sector (Quadro 3 e Gráficos 6 a 9);
  - Execução e fluxos financeiros por estado das decisões (Quadro 3-A).
- Informação com detalhe ao nível das decisões agrupadas por estado e sector/subsector:
  - Fluxos financeiros com a CE - Despesa certificada, pedidos de pagamento e transferências da Comissão Europeia satisfeitas e por satisfazer (Quadro 4). Permite identificar, ao nível de cada decisão, os pedidos de pagamento à CE que aguardavam satisfação em 31.12.2009 para os projectos com pedido de saldo, com reprogramação pendente e em execução;



- Das cinquenta e quatro decisões em execução seis já tinham certificado à CE 80% da despesa (duas dos transportes);
  - Execução - Despesa validada e pagamentos aos executores com taxas de execução da despesa validada sobre a aprovada e dos pagamentos efectuados sobre a despesa fundo validada (Quadro 5). Permite apurar ao nível de cada decisão a taxa de validação e a taxa de execução de pagamentos ao executor (quando esta taxa ultrapassa os 100% a decisão está a beneficiar de adiantamentos);
  - Das cinquenta e quatro decisões em execução dezoito já tinham recebido 80% do Apoio (três dos transportes).
- Informação sobre as condições de execução das decisões agrupadas por estado e sector/sub-sector:
    - Decisões anuladas e respectivos montantes (Quadro 6) e Decisões encerradas, com saldo pago ou a aguardar pagamento de saldo pela Comissão Europeia, com evidência da respectiva taxa de execução final;
    - Calendários de encerramento e taxas de validação da despesa nas decisões em execução (Quadro 7). Permite comparar a taxa de validação da despesa com as datas de aprovação e de encerramento da decisão.
  - Quadros síntese:
    - Número de executores, decisões e montantes aprovados por Sector e subsector (Quadro 8);
    - Fluxos anuais a partir de 2006 - Despesa Fundo Validada, Pagamentos aos Executores, Transferências da CE e Despesa Fundo Certificada (Quadro 9);
    - Despesa Validada e por validar por sector, após quebras em decisões encerradas (Quadro 10).

## DESTAQUES

Em termos da execução do Fundo de Coesão, reportada no presente ponto de situação, destacam-se os seguintes aspectos:

- A despesa certificada total ascende a 3.264 milhões de euros, 71% do valor total aprovado. O acréscimo de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior é devido maioritariamente ao ambiente (7 pontos);
- Em 31.12.2009 nos pedidos de saldo o montante a aguardar pagamento da CE (108,7 milhões de €) ultrapassava o de 2008. Nos pedidos com reprogramação pendente e em execução os montantes a aguardar pagamento (1,7 milhões de € e 25,3 milhões de €) são bastante inferiores a 2008;
- A despesa validada total no Fundo de Coesão ascende a 3.522 milhões de euros. O acréscimo de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior é devido maioritariamente ao ambiente (7 pontos);



- A taxa de despesa validada no ambiente (76%) aproxima-se da dos transportes (77%);
- Nos subsectores dos transportes os portos e a rodovia já ultrapassam os 90% de despesa validada e a ferrovia e metro mantém-se nos 73%;
- Nos subsectores do ambiente as taxas de execução de despesa validada situam-se entre os 69% e os 84% exceptuando o projecto da Central Hidroeléctrica do Alqueva já encerrado;
- As taxas de validação de despesa inferiores a 10% afectam uma decisão nos transportes e três no ambiente, entre 10% e 50% afectam três decisões nos transportes e sete no ambiente. Já têm validação superior a 80% da despesa três decisões nos transportes e doze no ambiente;
- Em 2009 há mais dez decisões encerradas do que em 2008, das quais oito com saldo pago (cinco nos transportes e três no ambiente) e duas com pedido de saldo e a aguardar pagamento;
- As decisões encerradas respeitam a 42% do apoio aprovado, nos 58% relativos a decisões em execução 9% têm pedidos de reprogramação pendentes;
- Nos 995 milhões de despesa por validar estão envolvidas nove decisões de transportes e quarenta e duas de ambiente;
- Os valores de despesa validada e certificada baixam em relação a 2008, ficando a despesa validada próxima do valor de 2007;
- As transferências da UE e os pagamentos aos executores sobem em relação a 2008, ficando ambos abaixo dos valores de 2007;
- Os valores máximos de despesa Fundo certificada, transferências da UE e pagamentos aos executores foram atingidos em 2007 – 478,6 milhões de €, 425,8 milhões de € e 344,3 milhões de euros;
- O valor máximo de despesa fundo validada atingiu-se em 2008 com 341,6 milhões de €.

No primeiro semestre de 2011 deverá ficar validada e certificada a totalidade da despesa a executar até 2010.

Apesar da disparidade no número de decisões em execução os montantes de despesa fundo a validar para os transportes e o ambiente são próximos. A despesa total no ambiente (562,6 milhões de €) é superior à dos transporte (430 milhões de €).



## GLOSSÁRIO DE TERMOS

**Apoio Aprovado** – Montante de apoio do Fundo de Coesão comprometido para a decisão, na fracção aprovada inicialmente e nas fracções seguintes. O processo de adopção de compromissos foi encerrado em 2006.

**Apoio Total Aprovado** – sinónimo de Apoio Aprovado.

**Apoio Total Fundo** – sinónimo de Apoio Aprovado.

**Autoridade de certificação** – Autoridade pública ou organismo público nacional, regional ou local, designado pelo Estado-Membro para certificar as declarações de despesas e os pedidos de pagamento antes de os mesmos serem enviados à Comissão Europeia. No caso do Fundo de Coesão II a autoridade de Certificação é o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR).

**Data de elegibilidade das despesas** – Data até à qual as despesas têm que ser efectivamente pagas pelos executores para poderem ser comparticipadas pelo Fundo de Coesão. A data limite é fixada na Decisão da Comissão Europeia para o projecto, ou grupo de projectos, não podendo, no âmbito do Fundo de Coesão II, ultrapassar a data de 31 de Dezembro de 2010.

**Decisão da Comissão** – Acto formal da Comissão Europeia que aprova o financiamento comunitário a um projecto ou grupo de projectos e estabelece um conjunto de regras a que deve obedecer a execução do investimento e as relações entre as entidades nacionais e comunitárias.

**Despesa certificada** – Corresponde à despesa elegível validada pela Gestão Sectorial de Gestão, e certificada pela Autoridade de Certificação e comunicada à Comissão Europeia para efeitos de reembolso.

**Despesa fundo certificada** – Parte da despesa certificada correspondente à taxa de apoio do fundo aprovada na decisão.

**Despesa validada** – Despesa efectivamente paga, perfeitamente identificada e claramente associada à concretização de um projecto, cuja natureza e data de realização respeitem a Decisão da Comissão Europeia, bem como as demais regras nacionais e comunitárias aplicáveis e que foi devidamente validada pela gestão sectorial.

**Despesa fundo validada** – Parte da despesa validada correspondente à taxa de apoio do fundo aprovada na decisão.

**Fundo de Coesão II** – O Fundo de Coesão, previsto no Tratado de Maastrich, é um instrumento financeiro criado com o objectivo de reforçar a Coesão Económica e Social dos Estados-Membro da União com produto nacional bruto por habitante, inferior a 90% da média comunitária. Aquando da instituição do Fundo, preenchiem esta condição os seguintes Estados-Membro: Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Com o alargamento da União Europeia, os novos Estados passaram igualmente a ser beneficiários do Fundo de Coesão.

Este Fundo apoia projectos com impacto significativo na área do Ambiente e dos Transportes - Redes Transeuropeias, com taxas de comparticipação que podem atingir 85% do investimento elegível. Nos projectos geradores de receitas a comparticipação comunitária aplica-se à parte do investimento que não é coberto pelas receitas geradas durante a vida útil do investimento (funding gap ou déficit de financiamento).

**Fundo de Coesão II aprovado** – sinónimo de Apoio Aprovado.

**Gestão sectorial** – Entidades designadas pelos membros do Governo competentes para os Transportes e o Ambiente e pelos Governos Regionais dos Açores e da Madeira para exercer funções de gestão identificadas no Regulamento de Aplicação do Fundo a Portugal – D.L. 191/2000, de 16 de Agosto. Em 2008 as estruturas de Gestão Sectorial dos Transportes e do Ambiente foram integradas no Programa Operacional de Valorização do Território pelos despachos MAOTDR n.º 13998/2008, de 20 Maio e n.º



14303/2008, de 23 Maio.

**Investimento Aprovado** – Montante de despesa sobre o qual é aplicada a taxa de apoio do FC aprovada na decisão. Corresponde à despesa elegível.

**Pedido de pagamento à CE** – Processo pelo qual a Autoridade de Certificação (IFDR) solicita à Comissão Europeia a transferência do apoio do Fundo nos termos regulamentares. Para os pedidos de reembolso é apresentada, mediante preenchimento de modelo próprio, uma declaração de certificação das despesas efectivamente pagas.

Os pedidos de pagamento à Comissão Europeia, assumem a forma de:

**Por conta ou adiantamento** - Montante equivalente a 20% do Fundo aprovado cuja transferência pela Comissão Europeia está condicionada pela assinatura de contratação equivalente a 20% do investimento aprovado.

**Reembolso das despesas certificadas e efectivamente pagas:**

**Intermédio** – Quando os pagamentos por conta e intermédios atingem o limite até saldo (80% do apoio ou 90%, conforme definido na decisão de aprovação) os pagamentos intermédios são encerrados.

**Saldo** – Efectuado após a apresentação do relatório final e concluído o processo de certificação por entidade de auditoria independente. Corresponde à diferença entre a despesa fundo total certificada (até ao limite da despesa fundo elegível) e os pagamentos já efectuados.

**Reprogramação** – A reprogramação pode ser de natureza temporal, física ou financeira. O pedido de reprogramação tem que ser apresentado antes da data limite para a execução da despesa elegível e tem que ser sempre objecto de comprovação documental que fundamente a alteração proposta. A aprovação de uma reprogramação dá origem a uma nova decisão da Comissão Europeia.

**SIFEC** – Sistema de Informação dos Fundos Estruturais e de Coesão, no IFDR.

**Taxa de Apoio** – Percentagem do financiamento comunitário no “Investimento Total Aprovado”, constante da Decisão da Comissão Europeia. Esta taxa é utilizada para calcular a comparticipação do fundo na despesa validada ou certificada.

**Taxa de Apoio do Fundo** – sinónimo de Taxa de Apoio.

**Taxa de Execução dos pagamentos** – pagamentos efectuados sobre despesa fundo validada.

**Taxa de Execução da validação** – despesa validada sobre despesa aprovada.

**Taxa de Execução final** – despesa certificada e aceite pela CE sobre despesa aprovada.

**Transferências da CE** – Montante das transferências efectuadas pela Comissão Europeia para a conta do Fundo de Coesão II, em Portugal, a título de pagamentos por conta ou de reembolsos da participação do Fundo na despesa certificada.

**Validação de despesas** – Acto pelo qual a Gestão Sectorial verifica a conformidade da despesa com as condições da candidatura e da Decisão de Aprovação (elegibilidade estrita), assegura a veracidade, regularidade e legalidade da despesa (elegibilidade formal), bem como as condições de elegibilidade aplicáveis (elegibilidade normativa).



## 1. Uma Visão Global

**Quadro 1. Despesa Certificada e Transferências da Comissão Europeia**

Un.: Euros

Sector	Aprovações (2000-2006) *			Despesa Certificada **		Pedidos de Pagamento a CE ***					Transferências da CE ***	
	Invest. Total	Apoio Total FC	Taxa Média de Apoio FC	Total	Fundo	Adiantamento	Intermédios	Saldo	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE	Total de PP's a CE	Satisfeitas	Não satisfeito
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*(3)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(6)+(7)+(8)	(11)	(12)=(10)-(11)
<b>SÍNTESE QUADRO 4</b>												
PORTOS	232.600.080	147.234.718	63%	206.974.102	131.180.670	29.140.496	81.096.757	23.894.447	104.991.204	134.131.700	116.919.617	17.212.083
RODOVIA	213.249.480	180.657.172	85%	197.941.713	167.701.499	28.187.879	119.683.296	19.830.324	139.513.620	167.701.498	162.947.295	4.754.202
FERROVIA E METRO	1.655.674.758	1.293.667.982	78%	1.167.846.254	903.591.770	265.100.899	720.534.936	41.112.462	761.647.398	1.026.748.297	992.572.045	34.176.252
AEROPORTO	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	2.764.084	8.292.251	2.269.952	10.562.203	13.326.287	13.326.287	0
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>	<b>1.590.068.935</b>	<b>1.215.800.226</b>	<b>325.193.358</b>	<b>929.607.236</b>	<b>87.107.185</b>	<b>1.016.714.422</b>	<b>1.341.907.779</b>	<b>1.285.765.244</b>	<b>56.142.534</b>
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	525.042.440	351.667.727	67%	348.539.670	245.812.108	53.801.421	182.664.624	24.569.603	207.234.226	261.035.648	247.031.505	13.988.435
ABASTECIMENTO de ÁGUA	301.324.280	223.168.732	74%	189.885.949	142.147.137	46.312.237	123.471.908	8.479.563	131.951.471	178.263.708	178.263.708	0
ÁGUAS RESIDUAIS	655.196.645	428.227.661	65%	406.567.918	270.983.612	76.915.723	207.591.551	32.946.991	240.538.542	317.454.265	286.042.380	31.411.885
MULTI-SECTORIAL	900.735.755	594.207.596	66%	639.566.738	430.436.861	117.584.778	342.181.377	29.986.944	372.168.321	489.753.098	459.441.593	30.311.505
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.814	12.910.687	14.972.482	4.678.643	19.651.125	32.561.812	32.561.812	0
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>2.472.669.582</b>	<b>1.654.185.673</b>	<b>67%</b>	<b>1.670.819.948</b>	<b>1.143.800.943</b>	<b>312.039.935</b>	<b>884.427.206</b>	<b>104.460.805</b>	<b>988.888.011</b>	<b>1.300.927.946</b>	<b>1.221.401.353</b>	<b>79.510.885</b>
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.668.483	6.518.211	85%	3.068.093	2.607.879	1.133.642	2.607.877	0	2.607.877	3.741.519	3.607.335	134.183
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.599.810.981</b>	<b>3.296.084.176</b>	<b>72%</b>	<b>3.263.956.976</b>	<b>2.362.209.048</b>	<b>638.366.935</b>	<b>1.816.642.319</b>	<b>191.567.990</b>	<b>2.008.210.309</b>	<b>2.646.577.244</b>	<b>2.510.773.932</b>	<b>135.787.603</b>

\* No Total Geral do 'Investimento Total Aprovado' e 'Apoio Total Aprovado' (colunas 1 e 2) não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apoio), respectivamente.

\*\* Os montantes de despesa certificada para os projectos 2000/PT/16/C/PE/003, 1996/PT/16/C/PE/003, 2000/PT/16/C/PE/008, 2003/PT/16/C/PE/003, 2002/PT/16/C/PE/005 e 2000/PT/16/C/PE/002 são apresentados até ao limite aprovado, apesar do montante total certificado ter sido superior.

\*\*\* Os Pedidos de Pagamento à CE e as Transferências da CE incluem: o montante de 1.772.907€ relativos ao projecto 1996/PT/16/C/PE/021 da C. M. Vila Real Sto António que, por lapso da CE foi efectuado na DGT sobre a conta do FCI apesar de se reportar ao FCI e também a dedução do montante de 6.190.617€ do projecto 2000/PT/16/C/PE/002 da Valor Ambiente que, embora tenha dado entrada na conta do FCI diz respeito ao encerramento do compromisso aprovado no FCI.

**Quadro 2. Despesa Validada e Pagamentos ao Executor**

Un.: Euros

Sector	Invest. Total Aprovado *	Apoio Total Aprovado *	Taxa Média de Apoio FC	Despesa Total validada	Despesa FC validada	% Execução Validação	Pagamentos ao Executor **	% Execução Pagamentos (face à despesa)
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)	(6)=(4)/(1)	(7)	(8)=(7)/(5)
<b>SÍNTESE-QUADRO 5</b>								
PORTOS	232.600.080	147.234.718	63%	211.433.228	133.986.354	91%	116.919.617	87%
RODOVIA	213.249.480	180.657.172	85%	197.941.714	167.701.499	93%	162.947.296	97%
FERROVIA E METRO	1.655.674.758	1.293.667.982	78%	1.204.107.912	933.750.715	73%	942.233.229	101%
AEROPORTO	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	96%	13.326.287	100%
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>	<b>1.630.789.721</b>	<b>1.248.764.855</b>	<b>77%</b>	<b>1.235.426.429</b>	<b>99%</b>
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	525.042.440	351.667.727	67%	377.672.081	263.450.900	72%	244.377.844	93%
ABASTECIMENTO de ÁGUA	329.543.584	245.744.175	75%	277.152.392	206.886.001	84%	188.129.594	91%
ÁGUAS RESIDUAIS	655.196.645	428.227.661	65%	453.506.268	299.705.008	69%	279.673.668	93%
MULTI-SECTORIAL	900.735.755	594.207.596	66%	718.569.066	483.606.803	80%	438.947.781	91%
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	95%	32.561.810	100%
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>2.472.669.582</b>	<b>1.654.185.673</b>	<b>67%</b>	<b>1.885.835.215</b>	<b>1.286.210.525</b>	<b>76%</b>	<b>1.183.690.696</b>	<b>92%</b>
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.668.483	6.518.211	85%	4.952.300	4.209.455	65%	4.350.217	103%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.599.810.981</b>	<b>3.296.084.176</b>	<b>72%</b>	<b>3.521.577.236</b>	<b>2.539.184.835</b>	<b>77%</b>	<b>2.423.467.342</b>	<b>95%</b>


\* No Total Geral do 'Investimento Total Aprovado' e 'Apoio Total Aprovado' (colunas 1 e 2) não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apoio), respectivamente.

\*\* Os Pagamentos ao Executor (coluna 7) incluem: o montante de 1.772.907€ relativos ao projecto 1996/PT/16/C/PE/021 da C. M. Vila Real Sto António que, por lapso da CE foi efectuado na DGT sobre a conta do FCI apesar de se reportar ao FCI e também a dedução do montante de 6.190.617€ do projecto 2000/PT/16/C/PE/002 da Valor Ambiente que, embora tenha dado entrada na conta do FCI diz respeito ao encerramento do compromisso aprovado no FCI.




## Decisões Aprovadas e Despesa Validada

**Gráfico 1.** Total de Aprovações FC II por Sector

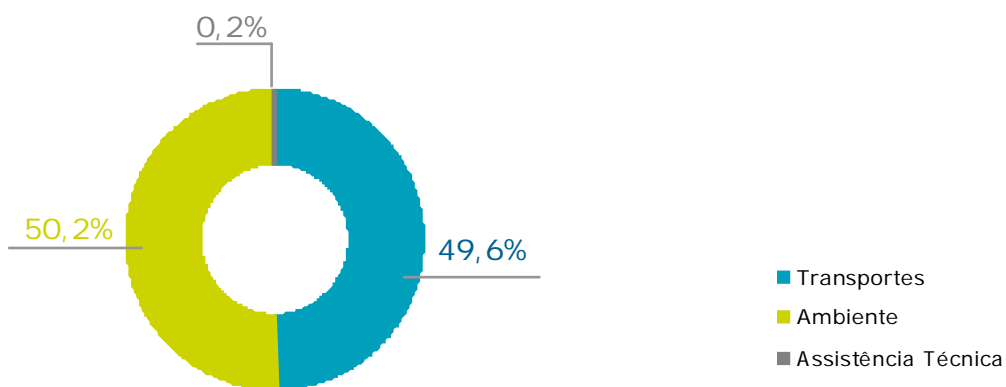


**Gráfico 2.** Despesa FC II Validada e por Validar

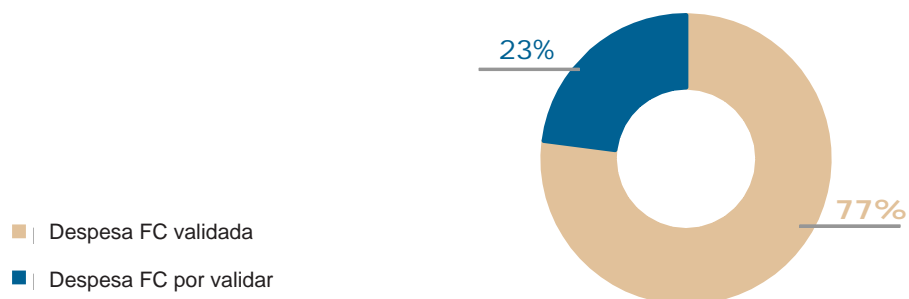




## Fluxos Financeiros e Execução até 31-12-2009


**Gráfico 3. Total FC II**

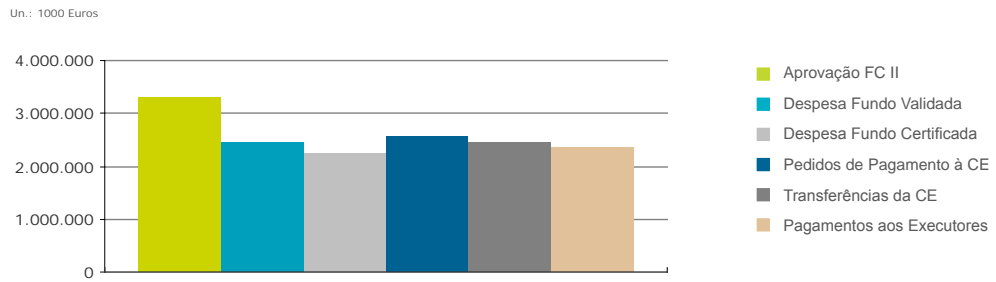

**Gráfico 4. Transportes e Ambiente**

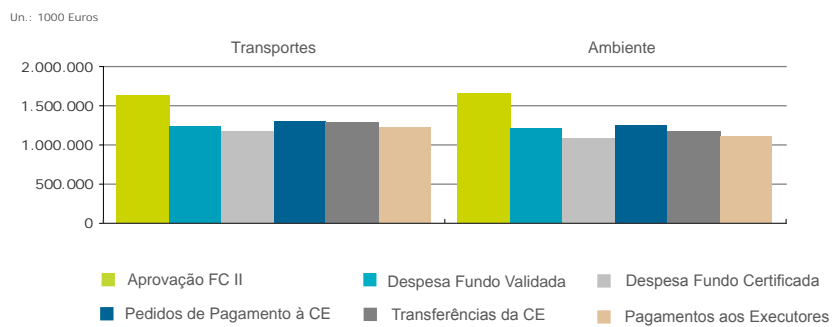


**Gráfico 5. Assistência Técnica**

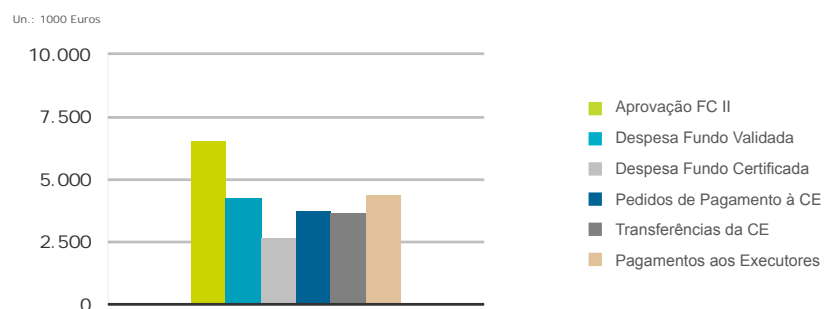




## Estado de Realização das Decisões


**Gráfico 6.** Número Total de Decisões por Sector

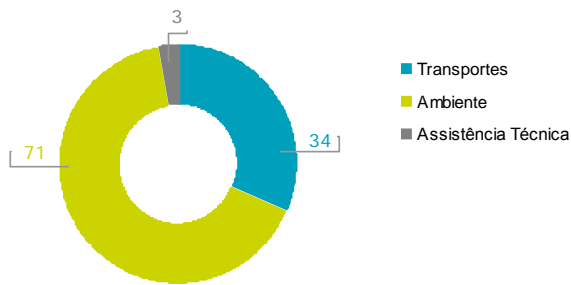


**Gráfico 7.** Número Total de Decisões por Estado

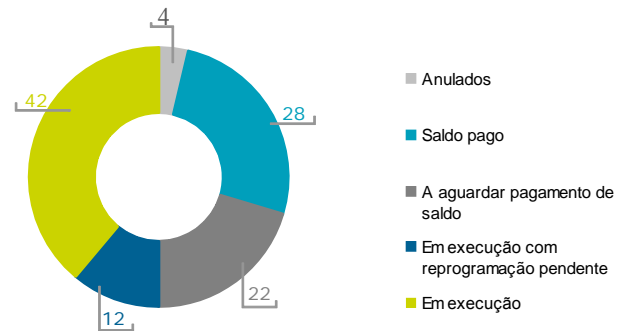

**Gráfico 8.** Número Total de Decisões dos Transportes por Estado

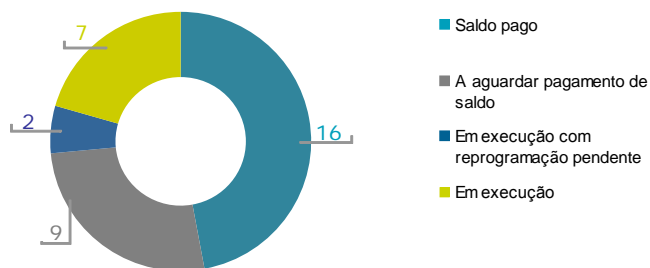

**Gráfico 9.** Número Total de Decisões do Ambiente por Estado

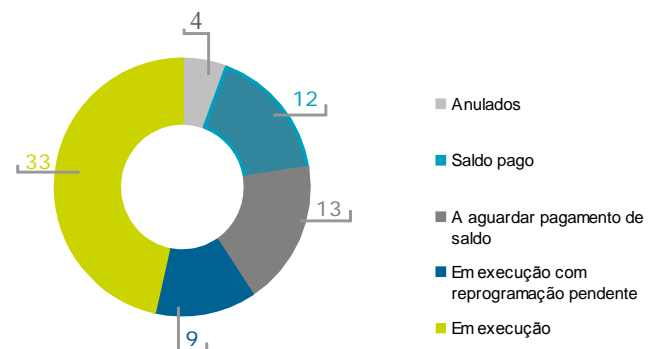

**Quadro 3A.** Despesa Validada, Pedidos de Pagamento à CE, Despesa Certificada e Transferências da CE por Estado

Un.: Euros

Estado	Aprovações (2000-2006) *			Despesa Validada		Pedidos de Pagamento à CE					Despesa Certificada		Transferências da CE	
	Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)	% Fundo por estado (3)	Total (4)	Fundo (5)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Total (11)	Fundo (12)	Satisfeitas (13)	Não satisfeito (14)=(10)-(13)
SALDO PAGO	897.021.333	659.683.024	20%	867.087.067	639.048.016	119.066.219	436.192.598	82.823.094	519.015.692	638.081.911	867.138.041	639.089.225	638.066.200	0
AGUARDA PAGAMENTO DE SALDO	983.320.486	728.370.249	22%	930.343.306	690.019.222	136.472.522	447.639.135	108.744.896	556.384.031	692.856.553	934.594.332	692.856.551	584.110.195	108.746.357
REPROGRAMAÇÃO PENDENTE	426.269.656	284.690.069	9%	216.556.120	143.103.438	57.682.044	119.654.394	0	119.654.394	177.336.438	183.856.658	120.880.912	175.641.721	1.694.718
EM EXECUÇÃO	2.293.199.506	1.623.340.835	49%	1.507.590.742	1.067.014.160	325.146.150	813.156.192	0	813.156.192	1.138.302.342	1.278.367.947	909.382.361	1.112.955.815	25.346.528
<b>TOTAL</b>	<b>4.599.810.981</b>	<b>3.296.084.176</b>	<b>100%</b>	<b>3.521.577.236</b>	<b>2.539.184.835</b>	<b>638.366.935</b>	<b>1.816.642.319</b>	<b>191.567.990</b>	<b>2.008.210.309</b>	<b>2.646.577.244</b>	<b>3.263.956.976</b>	<b>2.362.209.048</b>	<b>2.510.773.932</b>	<b>135.787.603</b>

NOTA: A despesa validada é inferior à despesa certificada, dado que em alguns projectos com 'saldo pago' e 'a aguardar saldo' foram efectuadas correcções à despesa sem que tenha sido corrigido ainda o pedido de saldo à CE.

\* No Total do 'Investimento Total Aprovado' e 'Apoio Total Aprovado' (colunas 1 e 2) não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350 € (inv. total) e 21.039.968€ (apoio), respectivamente.



## 2. Execução Financeira por Decisão

**Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE**

Código	Designação	nº Projetos	Executor	Aprovações (2000-2006) *		Despesa Certificada **		Pedidos de Pagamento a CE ***			Transferências da CE ***				
				Invest. Total	Apolo Total FC	Total	Fundo	Adiantamento	Intermediários	Saldo	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa a CE	Total de PP's a CE	Satisfeitas	Não satisfeitas	
				(1)	(2)	(3)	(4)-(6)-(7)-(8)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(10)-(11)	(12)	(13)	(14)
<b>COM SALDO PAGO</b>															
<b>TRANSPORTES</b>															
1997/PT/1.6/CF/PT/005	Terminal Multissé. Porto de Setúbal	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	29.016.961	14.798.650	51%	29.016.961	14.798.650	2.976.360	8.929.080	2.893.210	11.822.290	14.798.650	14.798.650	0
2000/PT/1.6/CF/PT/010	Acessibilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias ao Porto de	2	Adm. Porto Aveiro	35.098.387	17.549.193	50%	35.098.387	17.549.193	3.913.069	10.517.051	2.305.499	12.822.550	16.735.619	16.735.619	0
2003/PT/1.6/CF/PT/001	Ext. Cas. Res. Ra para montante - 1ª fase (estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	320.000	272.000	85%	320.000	272.000	68.000	44.497	32.884	77.381	145.381	145.381	0
2003/PT/1.6/CF/PT/005	Terminal Estromas (Estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	480.000	408.000	85%	480.000	408.000	102.000	30.479	152.446	182.925	284.925	284.925	0
2003/PT/1.6/CF/PT/006	Reabilitação do Porto de São Roque	1	Adm. Portos Trilng. Grupo Ocid.	7.637.210	6.491.628	85%	7.637.210	6.491.628	1.298.326	3.894.977	1.298.326	5.193.302	6.491.628	6.491.628	0
<b>RODOVIA</b>															
2000/PT/1.6/CF/PT/005	IP2 - EN216 e a EN102	1	Inst. Est. Portugal	14.148.542	12.026.261	85%	14.148.542	12.026.261	2.494.345	7.483.033	2.048.883	9.531.916	12.026.261	12.026.261	0
2000/PT/1.6/CF/PT/006	IP2 / IP5	1	Inst. Est. Portugal	23.401.331	19.871.131	85%	23.401.331	19.871.131	16.721.342	11.860.584	-112.025	11.748.559	16.721.342	16.721.342	0
2000/PT/1.6/CF/PT/007	IP6 - Lamo Atraves / Mourais	1	Inst. Est. Portugal	12.168.274	10.343.033	85%	12.168.274	10.343.033	2.188.758	7.757.275	-1.173.074	6.584.201	9.169.959	9.169.959	0
2000/PT/1.6/CF/PT/008	IP3 Unil Castro Daire	1	Inst. Est. Portugal	14.398.544	12.238.762	85%	14.398.544	12.238.762	2.447.752	7.343.287	2.447.753	9.791.010	12.238.762	12.238.762	0
2002/PT/1.6/CF/PT/001	IP6 - Pincheira / CI	1	Inst. Est. Portugal	58.048.073	49.340.862	85%	58.048.073	49.340.862	9.340.862	39.472.689	9.868.173	49.340.862	49.340.862	49.340.862	0
2004/PT/1.6/CF/PT/003	Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2	1	Inst. Est. Portugal	11.758.879	9.995.047	85%	11.758.879	9.995.047	2.322.827	5.073.211	1.996.412	7.669.623	9.995.047	9.995.047	0
<b>FERROVIA</b>															
2000/PT/1.6/CF/PT/003	Lig. Algarve II: P. Novo, Grandola, linha de Sines	1	REFER	113.379.290	90.703.432	80%	113.379.290	90.703.432	18.208.762	63.730.669	5.255.251	69.485.920	87.664.682	87.664.682	0
2001/PT/1.6/CF/PT/001	Ligação Algarve IV: Rimiro - PK04	1	REFER	9.284.578	7.427.662	80%	9.284.578	7.427.662	1.526.995	4.580.710	1.319.897	5.900.607	7.427.662	7.427.662	0
2003/PT/1.6/CF/PT/003	Ligação ao Algarve: Ermidas / Faro	1	REFER	173.996.419	139.197.136	80%	173.996.419	139.197.136	27.839.427	97.437.995	9.900.730	107.338.725	135.178.152	135.178.152	0
2003/PT/1.6/CF/PT/004	Lousado - Nive	1	REFER	73.077.814	39.462.020	54%	73.077.814	39.462.020	37.429.710	27.892.404	5.860.093	29.539.703	37.429.709	37.429.709	0
<b>AEROPORTO</b>															
2003/PT/1.6/CF/PT/011	Req. Mater. Aeroporto Lajes	1	SRE - Dir. Reg. Transp. Comunicações	17.948.598	13.820.420	77%	17.948.598	13.820.420	2.164.084	8.292.251	2.249.952	10.542.203	13.326.287	13.326.287	0
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1997/PT/1.6/CF/PT/015	RSU Oeste - 2ª fase	1	Resoste	20.574.180	17.488.013	85%	20.574.180	17.488.013	3.630.449	13.881.604	3.630.449	17.488.013	17.488.013	17.488.013	0
2000/PT/1.6/CF/PT/003	Aerros Sanitário da LIPOR	1	LIPOR	7.763.889	3.881.945	50%	7.763.889	3.881.945	776.389	2.329.167	776.389	3.105.556	3.881.945	3.881.945	0
2000/PT/1.6/CF/PT/011	RSU Bairo Tamaga	1	REGAT	14.624.096	12.450.482	85%	14.624.096	12.450.482	2.186.096	7.468.286	2.186.096	9.292.722	12.078.818	12.078.818	0
2000/PT/1.6/CF/PT/012	RSU Alto Tamaga	1	REGAT	13.522.161	11.493.837	85%	13.522.161	11.493.837	2.298.767	6.896.302	2.298.768	9.195.070	11.493.837	11.493.837	0
2000/PT/1.6/CF/PT/013	RSU Norte Alentejo	1	EGF/valor	12.643.600	10.747.030	85%	12.643.600	10.747.030	1.861.604	6.336.778	1.861.604	8.575.822	10.437.426	10.437.426	0
2001/PT/1.6/CF/PT/001	RSUs do Baixo Alentejo	1	AMALGA	17.710.801	13.938.400	79%	17.710.801	13.938.400	3.484.600	9.970.960	2.764.084	7.184.899	10.639.499	10.639.499	0
2001/PT/1.6/CF/PT/003	EEF - Resíduos Sólidos Urbanos - Acções Complementares para o ano 2001	8	EGF e outros	18.150.000	13.594.380	75%	18.150.000	13.594.380	2.718.870	8.156.610	2.718.870	10.875.480	13.594.380	13.594.380	0
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>															
1999/PT/1.6/CF/PT/001	Abast. Água Grande Porto Sul-Valé Sousa	1	Águas do Douro e Pinha	49.879.789	42.397.820	85%	49.879.789	42.397.820	8.479.563	25.438.694	8.479.563	33.918.257	42.397.820	42.397.820	0
1996/PT/1.6/CF/PT/003	SIMBA - 2ª fase	1	SIMBA	50.006.727	42.505.719	85%	50.006.727	42.505.719	32.229.911	10.175.889	42.505.720	42.505.720	42.505.720	42.505.720	0
2000/PT/1.6/CF/PT/004	ETAR de Sobradas	1	SIMAS Porto	32.692.032	10.232.606	31%	32.692.032	10.232.606	2.102.951	6.308.851	985.441	7.294.292	9.397.243	9.397.243	0
<b>MULTI-SECTORIAL</b>															
2002/PT/1.6/CF/PT/009	Abast. Água e Saneam. Yab. Ave. Est/Projs/Asses.	1	Águas Ave	3.140.000	2.669.000	85%	3.097.713	2.633.056	533.800	1.012.659	1.086.156	2.099.255	2.633.056	2.633.056	0
<b>EDIA</b>															
1994/PT/1.6/CF/PT/028	Central Hidroelétrica Aiqueva	1	EDIA	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.814	12.910.687	14.972.482	4.678.643	19.651.125	32.561.812	32.561.812	0
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1997/PT/1.6/CF/PT/005	Terminal Multissé. Porto de Setúbal	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	29.016.961	14.798.650	51%	29.016.961	14.798.650	2.976.360	8.929.080	2.893.210	11.822.290	14.798.650	14.798.650	0
2000/PT/1.6/CF/PT/010	Acessibilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias ao Porto de	2	Adm. Porto Aveiro	35.098.387	17.549.193	50%	35.098.387	17.549.193	3.913.069	10.517.051	2.305.499	12.822.550	16.735.619	16.735.619	0
2003/PT/1.6/CF/PT/001	Ext. Cas. Res. Ra para montante - 1ª fase (estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	320.000	272.000	85%	320.000	272.000	68.000	44.497	32.884	77.381	145.381	145.381	0
2003/PT/1.6/CF/PT/005	Terminal Estromas (Estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	480.000	408.000	85%	480.000	408.000	102.000	30.479	152.446	182.925	284.925	284.925	0
2003/PT/1.6/CF/PT/006	Reabilitação do Porto de São Roque	1	Adm. Portos Trilng. Grupo Ocid.	7.637.210	6.491.628	85%	7.637.210	6.491.628	1.298.326	3.894.977	1.298.326	5.193.302	6.491.628	6.491.628	0
<b>RODOVIA</b>															
2000/PT/1.6/CF/PT/005	IP2 - EN216 e a EN102	1	Inst. Est. Portugal	14.148.542	12.026.261	85%	14.148.542	12.026.261	2.494.345	7.483.033	2.048.883	9.531.916	12.026.261	12.026.261	0
2000/PT/1.6/CF/PT/006	IP2 / IP5	1	Inst. Est. Portugal	23.401.331	19.871.131	85%	23.401.331	19.871.131	16.721.342	11.860.584	-112.025	11.748.559	16.721.342	16.721.342	0
2000/PT/1.6/CF/PT/007	IP6 - Lamo Atraves / Mourais	1	Inst. Est. Portugal	12.168.274	10.343.033	85%	12.168.274	10.343.033	2.188.758	7.757.275	-1.173.074	6.584.201	9.169.959	9.169.959	0
2000/PT/1.6/CF/PT/008	IP3 Unil Castro Daire	1	Inst. Est. Portugal	14.398.544	12.238.762	85%	14.398.544	12.238.762	2.447.752	7.343.287	2.447.753	9.791.010	12.238.762	12.238.762	0
2002/PT/1.6/CF/PT/001	IP6 - Pincheira / CI	1	Inst. Est. Portugal	58.048.073	49.340.862	85%	58.048.073	49.340.862	9.340.862	39.472.689	9.868.173	49.340.862	49.340.862	49.340.862	0
2004/PT/1.6/CF/PT/003	Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2	1	Inst. Est. Portugal	11.758.879	9.995.047	85%	11.758.879	9.995.047	2.322.827	5.073.211	1.996.412	7.669.623	9.995.047	9.995.047	0
<b>FERROVIA</b>															
2000/PT/1.6/CF/PT/003	Lig. Algarve II: P. Novo, Grandola, linha de Sines	1	REFER	113.379.290	90.703.432	80%	113.379.290	90.703.432	18.208.762	63.730.669	5.255.251	69.485.920	87.664.682	87.664.682	0
2001/PT/1.6/CF/PT/001	Ligação Algarve IV: Rimiro - PK04	1	REFER	9.284.578	7.427.662	80%	9.284.578	7.427.662	1.526.995	4.580.710	1.319.897	5.900.607	7.427.662	7.427.662	0
2003/PT/1.6/CF/PT/003	Ligação ao Algarve: Ermidas / Faro	1	REFER	173.996.419	139.197.136	80%	173.996.419	139.197.136	27.839.427	97.437.995	9.900.730	107.338.725	135.178.152	135.178.152	0
2003/PT/1.6/CF/PT/004	Lousado - Nive	1	REFER	73.077.814	39.462.020	54%	73.077.814	39.462.020	37.429.710	27.892.404	5.860.093	29.539.703	37.429.709	37.429.709	0
<b>AEROPORTO</b>															
2003/PT/1.6/CF/PT/011	Req. Mater. Aeroporto Lajes	1	SRE - Dir. Reg. Transp. Comunicações	17.948.598	13.820.420	77%	17.948.598	13.820.420	2.164.084	8.292.251	2.249.952	10.542.203	13.326.287	13.326.287	0
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1997/PT/1.6/CF/PT/015	RSU Oeste - 2ª fase	1	Resoste	20.574.180	17.488.013	85%	20.574.180	17.488.013	3.630.449	13.881.604	3.630.449	17.488.013	17.488.013	17.488.013	0
2000/PT/1.6/CF/PT/003	Aerros Sanitário da LIPOR	1	LIPOR	7.763.889	3.881.945	50%	7.763.889	3.881.945	776.389	2.329.167	776.389	3.105.556	3.881.945	3.881.945	0
2000/PT/1.6/CF/PT/011	RSU Bairo Tamaga	1	REGAT	14.624.096	12.450.482	85%	14.624.096	12.450.482	2.186.096	7.468.286	2.186.096	9.292.722	12.078.818	12.078.818	0
2000/PT/1.6/CF/PT/012	RSU Alto Tamaga	1	REGAT	13.522.161	11.493.837	85%	13.522.161	11.493.837	2.298.767	6.896.302	2.298.768	9.195.070	11.493.837	11.493.837	0
2000/PT/1.6/CF/PT/013	RSU Norte Alentejo	1	EGF/valor	12.643.600	10.747.030	85%	12.643.600	10.747.030	1.861.604						



Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006) *		Despesa Certificada **	Pedidos de Pagamento à CE ***		Transferências da CE ***		Unj: Euros					
				Invest. Total	Apelo Total FC		Taxa de Apelo FC	Total	Saldo	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE		Satisfeitas	Não satisfeito			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>																
<b>TRANSPORTES</b>																
	<b>PORTOS</b>															
2003/PT/16/CP/003	Porto de Camilal	1	Adm. Portos da RAM	71.360.733	41.389.225	58%	71.302.621	41.355.520	8.523.599	25.570.796	7.261.126	32.831.921	41.355.520	34.094.395	7.261.126	
2003/PT/16/CP/010	Req. Porto Pezã Vitória	1	Adm. Portos Fercalva e Gradosa	33.047.102	27.429.095	83%	32.750.522	27.182.934	4.479.757	17.463.519	5.239.657	22.703.176	27.182.933	21.943.276	5.239.657	
2005/PT/16/CP/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	1	Adm. Portos Ilhas S.Maria e S.Miguel	32.189.043	24.141.782	75%	32.032.968	24.024.725	4.528.356	14.485.070	4.711.300	19.196.370	24.024.726	19.313.426	4.711.300	
	<b>RODOVIA</b>															
2003/PT/16/CP/007	Eixo Viário Norte / Sul	1	Inst. Est. Portugal	47.300.650	40.205.553	85%	40.097.117	34.082.550	8.041.110	24.123.332	1.918.107	26.041.439	34.082.549	32.164.442	1.918.107	
2005/PT/16/CP/002	IC3 - Lapaço de Tomar ao IP6	1	Inst. Est. Portugal	17.793.485	14.946.527	84%	16.101.980	13.526.663	2.899.305	8.967.917	1.568.442	10.536.358	13.526.663	11.957.222	1.568.442	
2006/PT/16/CP/002	Plata Intermodal de Oulhinhas e Acozoss	1	Inst. Est. Portugal	14.231.702	11.669.996	82%	12.931.280	10.603.650	2.333.999	7.001.998	1.267.654	8.269.651	10.603.650	9.335.997	1.267.654	
	<b>FERROVIA</b>															
2000/PT/16/CP/012	Linha de Alagares III - Coroa / Píhal Novo	1	REFER	107.698.395	86.158.716	80%	100.872.669	80.698.135	17.231.745	52.837.622	10.628.749	63.466.391	80.698.134	70.069.365	10.628.749	
2000/PT/16/CP/013	Ligação Linha do Norte - Entrecompos / Orelas	1	REFER	49.004.255	39.203.403	80%	45.647.449	36.517.958	7.640.681	23.522.041	5.155.236	28.677.277	36.517.958	31.362.722	5.155.236	
2003/PT/16/CP/008	Nões - Braga	1	REFER	77.777.150	47.444.062	61%	60.188.444	36.714.952	9.688.812	24.703.653	2.522.086	27.226.139	36.714.952	34.192.465	2.522.086	
	<b>PORTOS</b>	<b>3</b>		<b>136.596.878</b>	<b>92.960.102</b>	<b>68%</b>	<b>136.086.110</b>	<b>92.563.179</b>	<b>17.831.712</b>	<b>57.519.385</b>	<b>17.212.082</b>	<b>74.731.467</b>	<b>92.563.179</b>	<b>75.351.097</b>	<b>17.212.082</b>	
	<b>RODOVIA</b>	<b>3</b>		<b>79.325.837</b>	<b>66.822.076</b>	<b>84%</b>	<b>69.130.377</b>	<b>58.211.863</b>	<b>13.364.414</b>	<b>40.093.246</b>	<b>4.754.202</b>	<b>44.847.449</b>	<b>58.211.863</b>	<b>53.457.660</b>	<b>4.754.202</b>	
	<b>FERROVIA</b>	<b>3</b>		<b>234.479.800</b>	<b>172.806.181</b>	<b>74%</b>	<b>206.708.562</b>	<b>183.931.045</b>	<b>34.561.236</b>	<b>101.063.316</b>	<b>18.306.491</b>	<b>119.369.807</b>	<b>153.931.043</b>	<b>135.624.552</b>	<b>18.306.491</b>	
	<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>9</b>		<b>450.402.515</b>	<b>332.588.359</b>	<b>74%</b>	<b>411.925.050</b>	<b>304.706.087</b>	<b>65.757.362</b>	<b>198.675.947</b>	<b>40.272.775</b>	<b>238.948.723</b>	<b>304.706.085</b>	<b>264.433.309</b>	<b>40.272.775</b>	
<b>AMBIENTE</b>																
	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1998/PT/16/CP/001	Tratamento e destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos das Ilhas de S. Miguel, Pico e Terceira	3	DIREA	22.837.290	18.966.696	83%	20.582.857	17.495.173	2.989.824	12.199.533	2.305.815	14.505.348	17.495.172	15.189.356	2.305.815	
1999/PT/16/CP/005	CVO Valersul	1	VALORSUL	20.750.000	10.375.000	50%	18.145.446	9.072.723	2.075.000	6.225.000	772.723	6.997.724	9.072.724	8.300.000	772.724	
2000/PT/16/CP/002	RSU da Ilha de Madeira - 2ª Fase	1	Valor Ambiente	107.624.794	71.871.837	67%	106.625.725	71.146.243	9.086.293	51.850.016	10.209.934	62.059.950	71.146.243	60.934.848	10.211.395	
2000/PT/16/CP/015	RSU Cova Beira	1	Águas do Zêzere e Cova	14.791.616	12.572.874	85%	12.655.058	10.756.800	0	10.058.299	698.500	10.756.799	10.756.799	10.058.299	698.499	
1999/PT/16/CP/006	Abast. Água Planalto Beirão	1	AM Planalto Beirão	28.219.304	22.575.443	80%	27.324.266	21.859.413	4.515.089	13.545.266	3.799.058	17.344.324	21.859.413	18.060.354	3.799.059	
	<b>AGUAS RESIDUAIS</b>															
2000/PT/16/CP/008	SIMULS	1	SIMULS	41.213.531	32.970.825	80%	41.213.531	32.970.825	6.594.165	19.782.495	6.594.165	26.376.660	32.970.825	26.376.660	6.594.165	
2002/PT/16/CP/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projectos/Assessorias	1	Águas do Algarve	2.484.916	2.112.179	85%	2.224.856	1.891.128	380.193	923.547	587.389	1.510.936	1.891.128	1.303.740	587.389	
2002/PT/16/CP/005	Saneamento Concelho Braga	1	AGERE	25.844.335	16.747.129	65%	25.844.335	16.747.129	3.349.426	10.048.277	3.349.426	13.397.703	16.747.129	13.397.703	3.349.426	
2002/PT/16/CP/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase	7	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204.474	56.273.803	85%	66.204.474	56.273.802	9.932.410	35.086.632	11.254.761	46.341.393	56.273.803	45.019.042	11.254.761	
	<b>MULTI-SECTORIAL</b>															
2000/PT/16/CP/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Cova - 1ª fase	4	Águas do Zêzere e Cova	54.910.000	34.593.300	63%	54.910.000	34.593.300	6.918.660	20.755.960	6.918.660	27.674.640	34.593.300	27.674.640	6.918.660	
2000/PT/16/CP/010	Estudos/Projectos/Assessorias - 1ª fase	9	ADP	34.117.770	29.000.104	85%	32.519.093	27.641.229	6.233.999	16.976.084	4.441.148	21.417.231	27.641.231	23.200.083	4.441.148	
2001/PT/16/CP/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabão - 1ª fase	8	Adcentro	63.695.000	44.586.500	70%	63.695.000	44.586.500	8.917.300	26.751.900	8.917.300	35.669.200	44.586.500	35.669.200	8.917.300	
2003/PT/16/CP/003	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase	4	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724.941	43.116.200	85%	50.724.941	43.116.200	9.732.801	24.760.159	8.623.240	33.383.399	43.116.200	34.492.960	8.623.240	
	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>6</b>		<b>165.503.700</b>	<b>113.806.407</b>	<b>69%</b>	<b>158.008.787</b>	<b>108.470.939</b>	<b>14.151.117</b>	<b>80.332.849</b>	<b>13.986.972</b>	<b>94.319.821</b>	<b>108.470.938</b>	<b>94.482.503</b>	<b>13.986.972</b>	
	<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>1</b>		<b>28.219.304</b>	<b>22.875.443</b>	<b>81%</b>	<b>27.324.266</b>	<b>21.859.413</b>	<b>4.515.089</b>	<b>13.545.266</b>	<b>3.799.058</b>	<b>17.344.324</b>	<b>21.859.413</b>	<b>18.060.354</b>	<b>3.799.059</b>	
	<b>AGUAS RESIDUAIS</b>	<b>10</b>		<b>135.747.256</b>	<b>108.103.936</b>	<b>79%</b>	<b>135.487.195</b>	<b>107.882.884</b>	<b>20.256.194</b>	<b>65.840.951</b>	<b>21.785.741</b>	<b>87.626.692</b>	<b>107.882.886</b>	<b>86.097.145</b>	<b>21.785.741</b>	
	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	<b>25</b>		<b>203.447.711</b>	<b>151.296.104</b>	<b>74%</b>	<b>201.849.034</b>	<b>149.937.229</b>	<b>31.792.760</b>	<b>89.244.122</b>	<b>28.900.348</b>	<b>118.144.470</b>	<b>149.937.230</b>	<b>121.036.883</b>	<b>28.900.347</b>	
	<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>	<b>42</b>		<b>532.917.971</b>	<b>395.781.890</b>	<b>74%</b>	<b>522.669.282</b>	<b>388.150.465</b>	<b>70.715.166</b>	<b>248.963.188</b>	<b>68.472.119</b>	<b>317.435.307</b>	<b>388.150.466</b>	<b>319.676.886</b>	<b>68.472.119</b>	
	<b>TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO</b>	<b>51</b>		<b>983.320.486</b>	<b>728.370.249</b>	<b>74%</b>	<b>934.594.332</b>	<b>692.856.551</b>	<b>136.472.522</b>	<b>447.639.136</b>	<b>108.744.894</b>	<b>556.384.030</b>	<b>692.856.552</b>	<b>584.110.195</b>	<b>108.744.357</b>	



**Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE**

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006) *		Taxa de Apoio FC (3)	Despesa Certificada **		Adiantamento (6)	Pedidos de Pagamento à CE ***		Transferências da CE ***	
				Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)		Total (4)	Fundo (5)=(4)-(3)		Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso à Despesa à CE (9)=(7)-(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)-(8)	Satisfeitas (11)
<b>TRANSPORTES</b>													
2006/PT/16C/PP/001	Porto de Funchal	1	Adm. Portos da RAM	23.450.644	14.755.145	63%	256.339	161.289	2.951.029	161.289	3.112.318	3.112.318	0
	<b>FERROVIA</b>												
2003/PT/16C/PP/002	Pinhel Novo - Setúbal	1	REFER	70.790.632	56.632.505	80%	33.930.675	27.144.539	11.887.379	27.144.539	39.031.918	39.031.918	0
	<b>PORTOS</b>												
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>23.450.644</b>	<b>14.755.145</b>	<b>63%</b>	<b>256.339</b>	<b>161.289</b>	<b>2.951.029</b>	<b>161.289</b>	<b>3.112.318</b>	<b>3.112.318</b>	<b>0</b>
	<b>FERROVIA</b>			<b>70.790.632</b>	<b>56.632.505</b>	<b>80%</b>	<b>33.930.675</b>	<b>27.144.539</b>	<b>11.887.379</b>	<b>27.144.539</b>	<b>39.031.918</b>	<b>39.031.918</b>	<b>0</b>
	<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>2</b>		<b>94.241.276</b>	<b>71.387.650</b>	<b>76%</b>	<b>34.187.014</b>	<b>27.305.828</b>	<b>14.838.408</b>	<b>27.305.828</b>	<b>42.144.235</b>	<b>42.144.235</b>	<b>0</b>
<b>AMBIENTE</b>													
	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>												
2002/PT/16C/RE/006	SIRVA - 3ª fase	1	AMAVE	17.356.026	14.058.381	81%	5.188.138	4.178.092	2.270.524	4.384.417	6.654.942	6.654.942	0
	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
2006/PT/16C/RE/002	Subsistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Mirão-Lima - 4ª fase	2	Águas Mirão-Lima	28.578.000	24.291.300	85%	6.851.694	5.823.940	4.888.260	5.823.939	10.682.199	10.682.199	0
	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>												
2003/PT/16C/RE/005	Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro - Barrinha de Esmeriz	2	SIRVA	23.020.923	13.862.344	59%	15.335.360	9.047.862	2.716.469	8.149.406	10.865.675	10.865.675	0
2004/PT/16C/RE/003	SIRVA - Cefima e Lavra - Fase I	1	SIRVA	12.352.923	5.929.403	48%	5.305.846	2.546.807	1.185.881	2.546.807	3.732.688	3.732.688	0
2004/PT/16C/RE/021	Dispõeção do Douro/Feira	1	CM Sta Maria da Feira	16.882.171	11.142.233	66%	5.106.405	3.370.227	2.228.446	3.370.227	5.998.673	5.998.673	1.623.325
2005/PT/16C/RE/002	Sistema Multimunicipal de Saneamento da Península de Setúbal	2	SINARSUL	72.963.200	47.419.580	65%	32.703.851	21.257.308	9.483.916	21.257.308	30.741.224	30.741.224	0
	<b>MULTI-SECTORIAL</b>												
2002/PT/16C/RE/010	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Coa - 2ª fase	4	Águas do Zêzere e Coa	51.736.003	32.593.682	63%	30.740.143	19.366.290	7.243.041	18.831.905	26.074.946	26.074.946	0
2005/PT/16C/RE/001	S. Mult. Abastec. de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Coa - Alargamento ao Montego Superior Sul	3	Águas do Zêzere e Coa	42.868.946	28.022.904	66%	16.479.808	10.876.673	5.604.581	10.876.673	16.481.254	16.409.860	71.394
2005/PT/16C/RE/005	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase	2	Águas Ave	63.825.212	33.827.362	53%	31.507.838	16.699.154	6.765.472	16.699.154	23.464.626	23.464.626	0
	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>												
	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>												
	<b>MULTI-SECTORIAL</b>												
	<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>	<b>18</b>		<b>329.163.404</b>	<b>210.867.189</b>	<b>64%</b>	<b>149.188.784</b>	<b>93.166.353</b>	<b>42.356.590</b>	<b>91.939.837</b>	<b>134.296.427</b>	<b>132.601.709</b>	<b>1.694.718</b>
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>													
2004/PT/16C/PP/001	AT FCI - DGDOR 2ª fase	1	IFDR	2.864.976	2.435.230	85%	480.860	408.731	487.046	408.731	895.777	895.777	0
	<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>1</b>		<b>2.864.976</b>	<b>2.435.230</b>	<b>85%</b>	<b>480.860</b>	<b>408.731</b>	<b>487.046</b>	<b>408.731</b>	<b>895.777</b>	<b>895.777</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE</b>	<b>21</b>		<b>426.269.656</b>	<b>284.690.069</b>	<b>67%</b>	<b>183.856.658</b>	<b>120.880.912</b>	<b>57.682.044</b>	<b>119.654.395</b>	<b>177.336.439</b>	<b>175.641.721</b>	<b>1.694.718</b>

Un.: Euros



Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE

Codigo	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006) *		Despesa Certificada **		Pedidos de Pagamento à CE ***			Transferências da CE ***				
				Invest. Total	Apelo total FC	Total	Fundo	Adiantamento	Intermédios	Saldo	Total de pedidos de Reembolso de Despesa à CE	Total de PP's a CE	Satisfeitas	Não satisfeito	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(10)-(11)	(10)=(6)+(7)+(8)	(11)	(12)=(10)-(11)
<b>PROJECTOS EM EXECUÇÃO</b>															
<b>TRANSPORTES</b>															
<b>FERROVIA</b>															
2000/PT/16/CF/001	Linha Norte V - Entrocamento / Albergaria	1	REFER	142.084.956	113.667.965	80%	114.344.650	91.475.720	22.733.593	79.567.575			102.301.168	102.301.168	0
2000/PT/16/CF/002	Linha do Norte VI - Ourense / Ovar	1	REFER	125.699.556	100.959.645	80%	106.719.164	85.399.331	20.111.929	70.391.751			90.503.680	90.503.680	0
2000/PT/16/CF/009	Metro Lisboa - Baixa - Chiado / Santa Apolónia	1	Metroportano de Lisboa	126.383.400	107.425.890	85%	100.252.279	85.214.437	22.606.940	79.124.290			101.731.230	101.731.230	0
2001/PT/16/CF/002	Metro de Lisboa - S. Sebastião / Alameda / Gil	1	Metroportano de Lisboa	132.102.000	98.019.684	74%	55.049.556	40.846.771	19.603.937	40.846.771			60.150.708	60.150.708	0
2003/PT/16/CF/012	Metro do Porto - Ligação ao Aeroporto	1	Metro do Porto	90.242.537	67.681.903	75%	64.405.070	48.303.803	14.801.817	39.343.705			54.145.522	54.145.522	0
2004/PT/16/CF/001	Metro de Lisboa - Ligeira Gil/Aeroporto	1	Metroportano de Lisboa	175.218.776	148.935.959	85%	148.935.959	2.937.541	33.096.880	2.937.542			36.034.422	36.034.422	0
2004/PT/16/CF/002	Linha do Norte VII - Vila Franca / Santarém	1	REFER	188.935.000	151.148.000	80%	125.439.741	100.351.793	30.229.600	90.688.799			120.918.399	105.048.638	15.869.761
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>7</b>		<b>980.666.225</b>	<b>787.439.046</b>	<b>80%</b>	<b>569.696.391</b>	<b>454.529.396</b>	<b>165.184.696</b>	<b>402.900.434</b>			<b>566.085.130</b>	<b>550.215.369</b>	<b>15.869.761</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>7</b>		<b>980.666.225</b>	<b>787.439.046</b>	<b>80%</b>	<b>569.696.391</b>	<b>454.529.396</b>	<b>163.184.696</b>	<b>402.900.434</b>			<b>566.085.130</b>	<b>550.215.369</b>	<b>15.869.761</b>
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
2002/PT/16/CF/002	RSU de LIPOR	1	LIPOR	53.515.700	26.597.303	50%	37.830.489	18.801.753	5.319.461	15.988.381			21.277.842	21.277.842	0
2004/PT/16/CF/002	Central de Valorização Orgânica da AMRIB	1	AM/Pinhalito Branco	34.372.767	25.779.575	75%	28.459.040	21.344.280	4.381.766	16.241.894			20.623.660	20.623.660	0
2004/PT/16/CF/007	Unid. Dig. Anarobolia Tratam. RUB - Tratado	1	Tratado	43.880.000	25.450.400	58%	3.193	1.862	5.090.036	1.862			5.091.932	5.091.932	0
2004/PT/16/CF/011	Valorização Orgânica - Agrupamento J e Vainor	1	VALNOR	8.785.000	6.500.900	74%	8.433.529	6.240.812	1.300.180	3.900.540			5.200.720	5.200.720	0
2004/PT/16/CF/012	Valoriz. RSU's Sul do Tejo - AMARSUL	1	AMARSUL	40.309.982	23.782.899	59%	3.850.187	2.271.964	4.756.578	2.271.964			7.028.542	7.028.542	0
2004/PT/16/CF/013	Sulduro - Valorização de Matéria Orgânica	1	SULDOURO	9.048.000	5.971.680	66%	0	0	0	0			0	0	0
2004/PT/16/CF/014	Espargueiro Braval	1	BRVAL	8.348.000	5.760.120	69%	3.343	2.306	2.306	2.306			2.306	2.306	0
2004/PT/16/CF/017	RUB do Sistema Multimunicipal do Algarve	1	ALGAR	10.207.763	7.451.667	73%	32.468	23.702	1.400.333	23.701			1.514.034	1.514.034	0
2004/PT/16/CF/018	Valorização Orgânica RUB's Valofris e Resioeste	1	VALORLIS	9.826.775	7.075.278	72%	5.697.473	4.102.181	1.415.056	4.102.181			5.517.237	5.517.237	0
2004/PT/16/CF/019	RESITEJO	1	RESITEJO	18.900.000	5.859.000	31%	127.640	39.568	39.568	39.568			39.568	39.568	0
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>															
2000/PT/16/CF/006	Inteligência dos sistemas multimunicipais de água potável de Barcelos e do Sotelo Algarves	2	Águas do Algarve	23.640.038	11.820.019	50%	14.718.967	7.359.484	2.364.004	7.092.011			9.456.015	9.456.015	0
2004/PT/16/CF/005	Agua do Oeste - 3ª Fase (Abastecimento)	1	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646.466	49.849.498	85%	35.475.401	30.154.091	9.669.900	29.909.698			39.879.598	39.879.598	0
2004/PT/16/CF/008	Agua do Oeste - 3ª Fase (Abastecimento)	1	Agua do Oeste	67.377.282	37.057.505	55%	37.860.467	20.823.268	9.089.992	20.556.012			29.646.004	29.646.004	0
2005/PT/16/CF/007	Gestão Optimizada de Água na RAM - 2ª Fase	1	Invest. Gestão Agua	19.270.000	14.067.100	73%	8.597.127	8.597.127	2.813.420	8.440.260			11.253.680	11.253.680	0
2006/PT/16/CF/001	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase	1	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932.703	43.685.490	81%	33.322.725	26.991.408	8.737.098	26.211.294			34.948.392	34.948.392	0

Un.: Euros



**Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE**

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006) *			Despesa Certificada **			Pedidos de Pagamento à CE ***			Transferências da CE ****	
				Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)	Taxa de Apoio FC (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)-(3)	Adiantamento (6)	Intermediários (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(8)+(9)-(6)	Satisfeitas (11)
1996/PT/16/C/PE/001	AGUAS RESIDUAIS	1	CMV B. Sto Antonio/ Aguas do Algarve	7.515.666	6.988.316	88%	2.498.602	1.223.812	1.772.907	2.130.406	3.903.313	3.903.313	0	
1998/PT/16/C/PE/002	Inercept. Tratam. Aguas Residuais VR Sto Antonio	1	SIMEIO	33.419.469	10.025.838	30%	30.411.909	9.123.573	2.005.148	6.015.502	8.020.670	8.020.670	0	
2000/PT/16/C/PE/001	ETAR de Alcantara	2	Aguas do Oeste	30.266.469	25.726.498	85%	16.885.748	14.352.885	6.335.849	14.245.349	20.581.198	20.581.198	0	
2000/PT/16/C/PE/014	Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão	6	SIMEIO	70.188.980	35.094.490	50%	17.884.906	8.942.453	7.018.898	8.942.452	15.961.350	15.961.350	0	
2003/PT/16/C/PE/001	Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve	4	Aguas do Algarve	46.998.260	26.319.026	56%	35.303.349	19.769.876	5.263.805	15.791.416	21.055.221	13.052.402	8.002.819	
2003/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lina - 3ª Fase	2	Aguas Minho-Lima	5.131.291	3.335.339	65%	2.233.127	1.451.533	769.694	1.451.533	2.221.227	2.221.227	0	
2004/PT/16/C/PE/006	Aguas do Oeste - 2ª Fase (saneamento)	1	Aguas do Oeste	71.842.856	50.289.999	70%	27.048.683	18.934.078	9.349.078	18.934.078	28.283.156	28.283.156	0	
2004/PT/16/C/PE/009	Sistema Inter municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento da Serra do Topo - 1ª Fase	3	Aguas do Ribatejo	41.878.432	28.477.334	68%	35.351	24.039	5.695.467	24.038	24.038	5.719.505	0	
2006/PT/16/C/PE/003	S.V. Ave-Algarve em Estuários/Projectos/Assessorias	1	Aguas Ave	4.300.000	3.655.000	85%	298.017	253.314	731.000	253.314	984.314	984.314	0	
<b>MULTI-SECTORIAL</b>														
2000/PT/16/C/PE/009	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho Lina - 1ª Fase	14	Aguas Minho-Lima	53.488.905	34.767.788	65%	40.232.819	26.151.332	3.383.895	24.430.336	24.430.336	27.814.231	0	
2001/PT/16/C/PE/002	Infraestruturas para a Gestão Optimizada da Água na Região Autónoma da Madeira - 1ª Fase	8	Invest. Gestão Agua	39.662.579	29.040.940	73%	24.323.803	17.809.888	5.808.188	17.424.563	23.232.751	23.232.751	0	
2001/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte Alentejano	8	Ag. Norte Alentejano	55.136.870	39.698.546	72%	37.533.582	27.024.179	7.939.709	23.819.129	31.758.838	31.758.838	0	
2002/PT/16/C/PE/008	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lina - 2ª Fase	4	Aguas Minho-Lima	76.752.240	49.888.956	65%	58.493.154	34.770.560	9.977.791	29.933.374	39.911.166	39.911.166	0	
2002/PT/16/C/PE/011	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Naboal - 2ª Fase	6	AdCoñito	71.036.000	49.725.200	70%	43.333.614	30.333.530	9.945.040	29.835.119	39.780.159	39.780.159	0	
2003/PT/16/C/PE/002	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo	6	Ag. Centro Alentejano	46.493.149	22.316.712	48%	37.019.344	17.769.238	4.518.420	13.334.949	17.863.369	16.915.606	1.339.763	
2004/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Fase I	2	Aguas Ave	78.955.989	42.873.102	54%	52.928.027	28.739.918	8.574.620	25.723.862	34.298.482	34.298.482	0	
2005/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª Fase	2	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338.000	44.487.300	85%	40.003.144	34.002.672	8.897.460	26.692.380	35.589.840	35.589.840	0	
2005/PT/16/C/PE/006	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada	3	Aguas do Mondego	62.264.151	33.000.000	53%	27.024.816	14.323.152	6.600.000	14.323.152	20.923.152	20.923.152	0	
SUB-TOTAL	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10		237.193.987	140.228.812	59%	84.437.962	52.828.418	23.753.454	42.542.866	66.295.840	66.295.840	0	
SUB-TOTAL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6		222.866.491	156.479.612	70%	133.154.466	93.925.377	32.974.414	92.209.274	125.183.688	125.183.688	0	
SUB-TOTAL	AGUAS RESIDUAIS	21		311.541.413	189.311.840	61%	132.599.692	74.975.563	38.941.866	67.788.089	106.729.955	98.727.136	8.002.819	
SUB-TOTAL	MULTI-SECTORIAL	53		536.127.883	346.798.544	64%	355.892.202	230.924.460	65.645.123	205.516.864	271.161.987	269.822.222	1.339.764	
SUB-TOTAL AMBIENTE		90		1.307.729.774	831.818.808	64%	706.084.323	452.653.817	161.314.858	408.056.613	569.371.471	560.028.888	9.342.582	
<b>ASSISTENCIA TÉCNICA</b>														
2000/PT/16/C/PA/001	Assistência Técnica ao Fundo de Coesão II	3	DGDR/65Transp./16FC-RAM	2.533.311	2.153.314	85%	1.230.147	1.045.625	430.663	1.045.624	1.476.287	1.476.287	0	
2003/PT/16/C/PA/001	A.T. Ambiente	1	MCD/ambiente	2.270.196	1.929.667	85%	1.357.066	1.153.523	215.933	1.153.523	1.369.456	1.369.456	134.184	
SUB-TOTAL ASSISTENCIA TÉCNICA		4		4.803.507	4.082.981	85%	2.587.233	2.199.148	646.596	2.199.146	2.845.742	2.711.559	134.184	
TOTAL EM EXECUÇÃO		101		2.293.199.506	1.623.340.835	71%	1.278.367.947	909.382.361	325.146.150	813.156.193	1.138.302.343	1.112.965.815	25.346.528	

Un.: Euros

\* No Total Geral do 'Investimento Total Aprovado' e 'Apoio Total Aprovado' (colunas 1 e 2) não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apolo), respectivamente.  
 \*\* Os montantes de despesa certificada para os projectos 2000/PT/16/C/PE/003, 2000/PT/16/C/PE/008, 2003/PT/16/C/PE/005 e 2000/PT/16/C/PE/002 são apresentados até ao limite aprovado, apesar do montante total certificado ter sido superior.  
 \*\*\* Os Pedidos de Pagamento à CE e as Transferências da CE incluem: o montante de 1.772.907€ relativos ao projecto 1996/PT/16/C/PE/001 da C. M. Vila Real S. do António que, por lapso da CE foi efectuado na conta do FCI diz respeito ao encerramento do compromisso aprovado no FCI.  
 6.190.617€ do projecto 2000/PT/16/C/PE/002 da Valor Ambiente que, embora tenha dado entrada na conta do FCI diz respeito ao encerramento do compromisso aprovado no FCI.



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado *	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio FC (3)-(4)/(3)	Despesa Total Validada (6)	Despesa FC Validada (8)	% Execução Validada (6)-(8)/(3)	Pagamentos ao Executor ** (7)	% Execução Pagamentos (Põe a despesa) (8)-(7)/(6)
<b>PROJECTOS COM SALDO PAGO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
1997/PT/16/CF/PT/026	Terminal Multissuporte de S. Estrela	Adm. Porto S. Estrela e Sesimbra	29.016.961	14.798.650	51%	14.798.650	14.798.650	100%	14.798.650	100%
2000/PT/16/CF/PT/010	Assistências Interoperacionais Ferroviárias e Rodoviárias ao Porto de Aveiro - Fase I	Adm. Porto Aveiro	38.098.387	17.849.193	50%	38.471.238	16.735.619	98%	16.735.619	100%
2003/PT/16/CF/PT/005	Est. Cale. Rollo para montante - 1ª fase (estação)	Adm. Porto S. Estrela e Sesimbra	320.000	272.000	85%	171.036	145.381	100%	145.381	100%
2003/PT/16/CF/PT/026	Terminal Externas (Estados)	Adm. Porto S. Estrela e Sesimbra	480.000	408.000	85%	335.206	284.925	100%	284.925	100%
2003/PT/16/CF/PT/026	Realização do Porto de São Roque	Adm. Portos TTAG, Grupo Odebrecht	7.637.210	6.497.628	85%	7.637.210	6.497.628	100%	6.497.628	100%
<b>RODOVIA</b>										
2000/PT/16/CF/PT/005	IP2 - EN216 e a EN102	Int. Est. Portugal	14.148.542	12.026.261	85%	14.148.542	12.026.261	100%	12.026.261	100%
IP3 / IP5		Int. Est. Portugal	23.401.333	19.891.131	85%	19.622.167	16.721.342	84%	16.721.342	100%
2000/PT/16/CF/PT/007	IP6 - Linho Alentejo / Mouricães	Int. Est. Portugal	12.168.274	10.843.033	89%	10.788.187	9.169.959	89%	9.169.959	100%
2000/PT/16/CF/PT/008	IP3 Túnel Castro Daire	Int. Est. Portugal	14.398.544	12.238.762	85%	14.398.544	12.238.762	100%	12.238.762	100%
2002/PT/16/CF/PT/001	IP6 - Paredão / IC1	Int. Est. Portugal	58.048.073	49.340.862	85%	58.048.073	49.340.862	100%	49.340.862	100%
2004/PT/16/CF/PT/003	Ligação de Torre do Moncorvo ao IP2	Int. Est. Portugal	11.758.879	9.995.047	85%	11.758.879	9.995.047	100%	9.995.047	100%
<b>FERROVIA</b>										
2000/PT/16/CF/PT/003	Lig. Algarve II - P. Novo. Grande. linha de Sines	REFER	113.379.290	90.703.432	80%	109.939.033	87.951.266	97%	87.664.633	100%
2007/PT/16/CF/PT/001	Ligação Algarve IV - Pinheiro - PK 94	REFER	9.284.578	7.427.662	80%	9.284.578	7.427.662	100%	7.427.662	100%
2007/PT/16/CF/PT/003	Ligação ao Alentejo. Ermidas / Faro	REFER	173.996.419	139.197.136	80%	168.972.889	136.178.151	97%	136.178.151	100%
2008/PT/16/CF/PT/004	Coastado - Riba	REFER	73.077.034	39.862.020	54%	69.314.276	37.429.799	95%	37.429.799	100%
<b>AEROPORTO</b>										
2008/PT/16/CF/PT/011	Req. Model. Aeroportos Lajes	SRE - Dir. Reg. Transportes Comunicações	17.948.598	13.620.420	76%	17.306.866	13.326.287	96%	13.326.287	100%
<b>PORTOS</b>										
SUB-TOTAL			72.552.558	39.519.471	54%	70.631.462	38.456.204	97%	38.456.203	100%
SUB-TOTAL			133.923.643	113.835.096	85%	126.811.337	109.489.636	96%	109.489.635	100%
<b>RODOVIA</b>										
SUB-TOTAL			369.738.101	276.790.250	75%	357.510.626	267.986.788	97%	267.700.206	100%
<b>AEROPORTOS</b>										
SUB-TOTAL			17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	96%	13.326.287	100%
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>										
			594.162.900	443.965.237	75%	574.260.481	429.258.916	97%	428.972.330	100%
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1997/PT/16/CF/PT/015	RSU Oeste - 2ª fase	RESIOESTE	20.974.180	17.488.053	83%	20.974.180	17.488.053	100%	17.488.053	100%
2000/PT/16/CF/PT/003	Alentejo Sanitário da LIPOR	LIPOR	7.763.889	3.881.945	50%	7.763.889	3.881.945	100%	3.881.945	100%
2000/PT/16/CF/PT/011	RSU Baixo Tâmega	REBAT	14.624.096	12.430.482	85%	14.210.374	12.078.818	97%	12.078.818	100%
2000/PT/16/CF/PT/012	RSU Alto Tâmega	RESAT	13.822.161	11.493.837	83%	13.822.161	11.493.837	100%	11.493.837	100%
2000/PT/16/CF/PT/013	RSU Norte Alentejo	EGF / Valhor	12.643.600	10.747.060	85%	12.249.324	10.411.926	97%	10.411.926	100%
2007/PT/16/CF/PT/001	RSUs de Baixo Alentejo	AMALGA	17.710.801	13.938.400	79%	14.434.855	11.360.231	82%	10.639.801	94%
2007/PT/16/CF/PT/003	EGF - Resíduos Sólidos Urbanos - Acções Complementares para o ano 2001	EGF	18.150.000	13.944.360	77%	18.129.026	13.578.640	100%	13.578.640	100%
<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>										
1999/PT/16/CF/PT/001	Abast. Água Grande Porto São Vito Sousa	Águas Douro e Paiva	49.879.719	42.397.820	85%	49.879.719	42.397.820	100%	42.397.820	100%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
1996/PT/16/CF/PT/003	SUARBA - 2ª fase	SUARBA	50.006.727	42.505.719	85%	50.006.727	42.505.719	100%	42.505.718	100%
2000/PT/16/CF/PT/004	ETA de Soteres	SMS Porto	32.692.032	10.322.606	31%	30.023.141	9.397.243	92%	9.397.243	100%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2002/PT/16/CF/PT/009	Abast. Água e Saneam. Vale Ave. - Estrog/a/Asom.	Águas Ave	3.140.000	2.409.000	77%	3.097.712	2.833.006	99%	2.833.006	100%
<b>EDIA</b>										
1994/PT/16/CF/PT/028	Central Hidroeléctrica Alqueva	EDIA	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	98%	32.561.813	100%
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
SUB-TOTAL			104.988.727	83.574.127	80%	100.883.809	80.293.449	96%	79.572.719	99%
SUB-TOTAL			49.879.719	42.397.820	85%	49.879.719	42.397.820	100%	42.397.820	100%
SUB-TOTAL			82.698.759	52.738.325	64%	80.029.868	51.902.961	97%	51.902.961	100%
SUB-TOTAL			3.140.000	2.409.000	77%	3.097.712	2.833.006	99%	2.833.006	100%
SUB-TOTAL			34.338.515	34.338.515	100%	34.338.515	34.338.515	100%	34.338.515	100%
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			302.858.433	215.717.787	71%	292.826.587	209.789.101	97%	209.048.366	100%
<b>TOTAL COM SALDO PAGO</b>			897.021.333	659.683.024	74%	867.087.067	639.048.016	97%	638.040.696	100%

Un.: Euros



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado *	Apoyo Total Aprovado *	Taxa de Apoio FC (3)-(2)/(1)	Despesa Total Validada (4)	Despesa FC Validada (5)	% Execução Validada (6)-(5)/(1)	Pagamentos ao Executor ** (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)-(7)/(5)
<b>PROJECTOS AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
2003/PT/16/CP/PT/003	Porto de Caminha	Adm. Portos de RAM	71.360.735	41.389.225	58%	71.302.621	41.355.520	100%	34.094.936	82%
2003/PT/16/CP/PT/010	Req. Porto Praia Vitória	Adm. Portos Terceira e Graciosa	33.047.102	27.429.095	83%	32.750.522	27.182.933	99%	21.943.276	81%
2005/PT/16/CP/PT/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	Adm. Portos Ilhas S.Maria e S.Miguel	32.189.043	24.141.782	75%	32.032.968	24.024.726	100%	19.313.426	80%
<b>RODOVIA</b>										
2003/PT/16/CP/PT/007	Eixo Várzea Norte / Sul	Inst. Est. Portugal	47.300.650	40.205.553	85%	40.097.117	34.082.549	85%	32.164.442	94%
2005/PT/16/CP/PT/002	IC3 - Ligação de Tomar ao Tíbe	Inst. Est. Portugal	17.793.485	14.946.527	84%	16.101.980	13.525.663	90%	11.957.222	88%
2006/PT/16/CP/PT/002	Ponte Internacional de Quilçarilha e Azevedo	Inst. Est. Portugal	14.231.702	11.669.996	82%	12.931.280	10.603.650	99%	9.335.997	88%
<b>FERROVIA</b>										
2000/PT/16/CP/PT/012	Linha de Algarve III - Coim / Pinhal Novo	REFER	107.698.395	86.158.716	80%	100.872.668	80.698.134	94%	70.069.365	87%
2000/PT/16/CP/PT/013	Ligação Linha do Norte - Entrecampos / Oeiras	REFER	49.004.256	39.203.403	80%	45.647.449	36.517.899	90%	31.362.722	86%
2003/PT/16/CP/PT/008	Niñot - Braga	REFER	77.777.150	47.444.062	61%	59.851.899	36.509.659	77%	29.371.961	80%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>PORTOS</b>		<b>136.596.878</b>	<b>92.940.102</b>	<b>68%</b>	<b>136.086.111</b>	<b>92.563.179</b>	<b>100%</b>	<b>75.351.097</b>	<b>81%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RODOVIA</b>		<b>79.325.837</b>	<b>66.822.076</b>	<b>84%</b>	<b>69.130.378</b>	<b>58.211.863</b>	<b>87%</b>	<b>53.457.661</b>	<b>92%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>FERROVIA</b>		<b>234.479.800</b>	<b>172.806.181</b>	<b>74%</b>	<b>206.372.016</b>	<b>153.725.752</b>	<b>85%</b>	<b>130.804.048</b>	<b>85%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>450.402.515</b>	<b>332.588.359</b>	<b>74%</b>	<b>411.588.505</b>	<b>304.500.794</b>	<b>91%</b>	<b>259.612.805</b>	<b>85%</b>
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1998/PT/16/CP/PE/001	Tratamento e Destino Final dos Resíduos Urbanos das Ilhas de S. Miguel, Pico e Terceira	DREPA	22.337.290	18.996.696	85%	20.982.557	17.495.173	92%	15.189.356	87%
1999/PT/16/CP/PE/005	CVO Valorsul	VALORSUL	20.750.000	10.375.000	50%	18.145.447	9.072.723	87%	8.300.000	91%
2000/PT/16/CP/PE/002	RSU da Ilha da Madeira - 2ª Fase	Valor Ambiente	107.624.794	71.871.837	67%	106.625.725	71.146.243	99%	60.936.310	86%
2000/PT/16/CP/PE/015	RSU Coim Beira	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	14.791.616	12.872.874	88%	12.871.247	10.685.850	88%	8.603.931	81%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>28.219.304</b>	<b>22.579.443</b>	<b>80%</b>	<b>27.324.266</b>	<b>21.859.413</b>	<b>97%</b>	<b>10.525.759</b>	<b>48%</b>
1999/PT/16/CP/PE/006	Abast. Água Pinhal Branco	AM Pinhal Branco								
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
2000/PT/16/CP/PE/008	SIMLIS	SIMLIS	41.213.831	32.970.825	80%	41.213.531	32.970.825	100%	26.376.660	80%
2002/PT/16/CP/PE/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projetos/Assessorias	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	2.484.916	2.112.179	85%	2.125.248	1.806.461	86%	1.085.558	58%
2002/PT/16/CP/PE/005	Saneamento Concelho Braga	AGERE	25.844.335	16.747.129	65%	25.844.335	16.747.129	100%	13.397.703	80%
2002/PT/16/CP/PE/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª Fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204.474	56.273.803	85%	65.967.055	56.071.997	100%	45.019.042	80%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2000/PT/16/CP/PE/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Coa - 1ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	54.910.000	34.593.300	63%	52.465.923	33.052.278	96%	27.674.640	84%
2000/PT/16/CP/PE/010	Estudos/Projetos/Assessorias - 1ª fase	ADP	34.117.770	29.000.104	85%	32.519.093	27.641.229	96%	23.012.652	83%
2001/PT/16/CP/PE/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabalo - 1ª fase	Afcentro	63.695.000	44.586.500	70%	62.647.424	43.883.197	98%	35.669.200	81%
2003/PT/16/CP/PE/003	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724.941	43.116.200	85%	50.724.941	43.116.200	100%	34.492.960	80%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		<b>165.503.700</b>	<b>113.806.407</b>	<b>69%</b>	<b>157.924.976</b>	<b>108.399.700</b>	<b>95%</b>	<b>93.029.597</b>	<b>86%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>28.219.304</b>	<b>22.575.443</b>	<b>80%</b>	<b>27.324.266</b>	<b>21.859.413</b>	<b>97%</b>	<b>10.525.759</b>	<b>48%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>		<b>135.747.256</b>	<b>108.103.936</b>	<b>80%</b>	<b>135.150.169</b>	<b>107.596.411</b>	<b>100%</b>	<b>85.848.964</b>	<b>80%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>		<b>203.447.711</b>	<b>151.296.104</b>	<b>74%</b>	<b>198.355.390</b>	<b>147.662.603</b>	<b>97%</b>	<b>120.849.452</b>	<b>82%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			<b>532.917.971</b>	<b>395.781.890</b>	<b>74%</b>	<b>518.754.801</b>	<b>385.518.427</b>	<b>97%</b>	<b>310.253.771</b>	<b>80%</b>
<b>TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>			<b>983.320.486</b>	<b>728.370.249</b>	<b>74%</b>	<b>930.343.306</b>	<b>690.019.222</b>	<b>95%</b>	<b>569.866.577</b>	<b>83%</b>

Un.: Euros



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado *	Apelo Total Aprovado *	Taxa de Apelo FC (3) = (2)/(1)	Despesa Total validada (4)	Despesa FC validada (5)	% Execução Validada (6) = (4)/(1)	Pagamentos ao Executor ** (7)	% Execução Pagamentos (face a despesa) (8) = (7)/(6)	Un.: Euros
<b>PROJECTOS COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE</b>											
<b>TRANSPORTES</b>											
<b>PORTOS</b>											
2006/PT/16/CP/001	Porto de Funchal	Adm. Portos da RAM	23.450.644	14.755.145	63%	4.715.465	2.966.970	20%	3.112.318	105%	
2003/PT/16/CP/002	Pinhal Novo - Setúbal	REFER	70.790.632	56.632.505	80%	33.930.674	27.144.540	48%	30.684.071	113%	
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>			<b>23.450.644</b>	<b>14.755.145</b>	<b>63%</b>	<b>4.715.465</b>	<b>2.966.970</b>	<b>20%</b>	<b>3.112.318</b>	<b>105%</b>	
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>			<b>70.790.632</b>	<b>56.632.505</b>	<b>80%</b>	<b>33.930.674</b>	<b>27.144.540</b>	<b>48%</b>	<b>30.684.071</b>	<b>113%</b>	
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>94.241.276</b>	<b>71.387.650</b>	<b>76%</b>	<b>38.646.139</b>	<b>30.111.510</b>	<b>41%</b>	<b>33.796.389</b>	<b>112%</b>	
<b>AMBIENTE</b>											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
2002/PT/16/CP/006	SIRVA - 3ª fase	ANAVE	17.356.026	14.058.381	81%	8.566.770	6.955.284	49%	6.955.284	100%	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
2006/PT/16/CP/002	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e do Saneamento do Minho - Lina - 4ª fase	Águas Minho-Lina	28.578.000	24.291.300	85%	9.872.210	8.391.378	35%	10.022.326	119%	
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
2003/PT/16/CP/005	Sistema Municipal de Saneamento da Ilha de Aveiro - Barrilha de Esmeriz	SIMRIA	23.020.923	13.582.344	59%	17.895.861	10.588.556	78%	10.865.876	103%	
2004/PT/16/CP/003	SIMRIA - Cértima e Leiria - Fase I	SIMRIA	12.352.923	5.909.403	48%	6.047.562	2.902.830	49%	2.793.865	96%	
2004/PT/16/CP/021	Despósito de Dourado/Feira	CMS de Mira de Feira	16.882.171	11.142.233	66%	5.106.405	3.370.227	30%	3.975.348	118%	
2005/PT/16/CP/002	Sistema Municipal de Saneamento da Península de Setúbal	SIMARSUL	72.953.200	47.419.560	65%	36.025.574	23.416.623	49%	26.083.599	111%	
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2002/PT/16/CP/010	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e do Saneamento do Alto Zêzere e Coa - 2ª fase	Águas do Zêzere e Coa	51.736.003	32.593.682	63%	36.430.537	22.951.238	70%	24.780.108	108%	
2005/PT/16/CP/005	S. Multi-Abastec. de Água e do Saneamento do Alto Zêzere e Coa - Alargamento ao Mondego Superior Sul	Águas do Zêzere e Coa	42.458.946	28.022.904	66%	24.866.450	16.413.177	59%	16.409.860	100%	
2005/PT/16/CP/005	S. Multi-Abastecimento de Água e do Saneamento do Vale do Ave - 2ª Fase	Águas-Ave	63.825.212	33.827.362	53%	31.507.838	16.699.154	49%	17.243.365	103%	
<b>SUB-TOTAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>			<b>17.356.026</b>	<b>14.058.381</b>	<b>81%</b>	<b>8.566.770</b>	<b>6.955.284</b>	<b>49%</b>	<b>6.955.284</b>	<b>100%</b>	
<b>SUB-TOTAL ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			<b>28.578.000</b>	<b>24.291.300</b>	<b>85%</b>	<b>9.872.210</b>	<b>8.391.378</b>	<b>35%</b>	<b>10.022.326</b>	<b>119%</b>	
<b>SUB-TOTAL ÁGUAS RESIDUAIS</b>			<b>125.209.217</b>	<b>78.073.560</b>	<b>62%</b>	<b>65.075.401</b>	<b>40.248.238</b>	<b>52%</b>	<b>43.718.688</b>	<b>109%</b>	
<b>SUB-TOTAL MULTI-SECTORIAL</b>			<b>158.020.161</b>	<b>94.443.948</b>	<b>60%</b>	<b>92.806.824</b>	<b>56.063.569</b>	<b>59%</b>	<b>58.433.333</b>	<b>104%</b>	
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			<b>329.163.404</b>	<b>210.867.189</b>	<b>64%</b>	<b>176.341.206</b>	<b>111.658.469</b>	<b>54%</b>	<b>119.129.632</b>	<b>107%</b>	
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>											
2004/PT/16/CP/001	AT FCI - DGR 2ª fase	IFDR	2.864.976	2.435.230	85%	1.568.775	1.333.459	55%	1.371.898	103%	
<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>			<b>2.864.976</b>	<b>2.435.230</b>	<b>85%</b>	<b>1.568.775</b>	<b>1.333.459</b>	<b>55%</b>	<b>1.371.898</b>	<b>103%</b>	
<b>TOTAL COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE</b>			<b>426.269.656</b>	<b>284.690.069</b>	<b>67%</b>	<b>216.556.120</b>	<b>143.103.438</b>	<b>51%</b>	<b>154.297.919</b>	<b>108%</b>	



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado - (C)	Apoio Total Aprovado - (D)	Taxa de Apoio FC (3)-(D)/(C)	Despesa Total Validada (E)	Despesa FC Validada (E)-(F)/(C)	Pagamentos ao Executor - (F)	% Execução Validada (G)-(F)/(C)	Pagamentos a Despesa (H)	% Execução (H)-(F)/(G)
<b>PROJECTOS EM EXECUÇÃO</b>											
<b>TRANSPORTES</b>											
<b>FERROVIA</b>											
2000/PT/16/C/PE/001	Linha Norte V - Entrocamento / Albergaria	REFER	142.084.956	113.667.965	80%	126.711.287	101.369.030	102.301.168	89%	102.301.168	101%
2000/PT/16/C/PE/002	Linha do Norte VI - Oulhanes / Ovar	REFER	125.699.956	100.589.646	80%	109.267.222	87.413.777	89.927.768	87%	89.927.768	103%
2000/PT/16/C/PE/009	Metro Lábios - Baixa - Chido / Santa Apolónia	Mitropoligano de Lisboa	126.383.400	101.425.890	80%	121.965.789	103.670.920	101.731.230	97%	101.731.230	98%
2001/PT/16/C/PE/002	Metro de Lisboa - S. Sebastião / Alameda / Gil	Mitropoligano de Lisboa	132.102.000	98.019.684	74%	59.499.856	40.846.771	43.426.236	42%	43.426.236	106%
2000/PT/16/C/PE/012	Metro de Porto - Ligação Aeroporto	Mitro de Porto	90.242.537	67.681.903	75%	64.405.071	48.303.803	51.123.882	71%	51.123.882	106%
2004/PT/16/C/PE/001	Metro de Lisboa - Ligação GIL/Aeroporto	Mitropoligano de Lisboa	148.935.959	148.935.959	100%	3.455.931	2.932.542	19.485.982	2%	19.485.982	66%
2004/PT/16/C/PE/002	Linha do Norte VII - Vila Franca / Santarém	REFER	188.935.020	151.148.000	80%	128.539.741	100.351.793	105.048.638	66%	105.048.638	108%
<b>FERROVIA</b>											
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>980.666.225</b>	<b>787.439.046</b>	<b>80%</b>	<b>606.294.936</b>	<b>484.893.635</b>	<b>513.044.905</b>	<b>62%</b>	<b>513.044.905</b>	<b>106%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>980.666.225</b>	<b>787.439.046</b>	<b>80%</b>	<b>606.294.936</b>	<b>484.893.635</b>	<b>513.044.905</b>	<b>62%</b>	<b>513.044.905</b>	<b>106%</b>
<b>AMBIENTE</b>											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
2002/PT/16/C/PE/002	RSU da LIPOR	LIPOR	53.515.700	26.597.303	50%	44.801.185	22.266.189	21.277.842	84%	21.277.842	96%
2004/PT/16/C/PE/002	Control de Valerização Orgânica da AMRB	AM Planalto Branco	34.372.767	25.779.875	75%	28.887.123	21.642.842	20.623.660	84%	20.623.660	91%
2004/PT/16/C/PE/007	Unid. Dig. Anveredã Tratam. RIB - Trabalho	Trabalho	43.880.000	25.450.400	58%	11.927.677	6.918.003	9.18.003	27%	9.18.003	100%
2004/PT/16/C/PE/011	Valerização Orgânica - Agrupamento de Valor	VALHOR	8.785.000	6.500.900	74%	8.785.000	6.500.900	5.200.720	100%	5.200.720	80%
2004/PT/16/C/PE/012	Valoriz. RSU's Sul do Tejo - AMARSUL	AMARSUL	40.309.982	23.782.889	59%	7.325.915	4.321.936	4.450.253	18%	4.450.253	108%
2004/PT/16/C/PE/013	Suaburo - Valerização de Matéria Orgânica	SUADURO	9.048.000	5.971.680	66%	4.289	2.883	0	0%	0	0%
2004/PT/16/C/PE/014	Equipar Braval	BRVAL	3.760.120	3.343	69%	2.747.480	2.005.661	2.005.661	100%	2.005.661	100%
2004/PT/16/C/PE/017	RUB do Sistema Municipal de Alagave	ALGAR	10.207.763	7.451.667	73%	5.697.473	4.102.181	4.102.181	98%	4.102.181	100%
2004/PT/16/C/PE/018	Valerização Orgânica RUB's Valeriz. e Reseque	VALORIS	9.856.775	7.075.278	72%	1.029.473	1.029.473	1.029.473	100%	1.029.473	100%
2004/PT/16/C/PE/019	RESITEJO	RESITEJO	18.900.000	8.889.000	31%	127.640	39.568	39.568	1%	39.568	100%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
2000/PT/16/C/PE/006	Intermédio dos sistemas municipais de água potável do Barcelos e do Soloneto Alagaves	Agua de Alagave	23.640.038	11.820.019	50%	23.640.038	11.820.019	9.456.015	100%	9.456.015	80%
2004/PT/16/C/PE/005	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª Fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646.468	49.849.498	85%	57.225.830	48.641.956	39.879.598	98%	39.879.598	82%
2004/PT/16/C/PE/008	Agua do Oeste - 3ª Fase (substacimento)	Agua do Oeste	67.377.282	37.057.858	55%	51.694.196	28.431.808	29.646.004	77%	29.646.004	104%
2005/PT/16/C/PE/007	Gestão Optimizada da Água na RAM - 2ª Fase	Invest. Escócia Agua	19.270.000	14.067.100	73%	15.555.057	11.355.192	11.253.680	81%	11.253.680	99%
2006/PT/16/C/PE/001	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª Fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932.703	43.685.950	81%	41.961.006	33.988.415	34.948.392	78%	34.948.392	103%
<b>AGUAS RESIDUAIS</b>											
1996/PT/16/C/PE/021	Intercom. Tratam. Águas Residuais VR S.º Antonio	CM.V.R. S.º Antonio/Agua de Alagave	7.515.666	6.388.316	85%	2.618.666	2.259.866	3.783.071	35%	3.783.071	167%
1998/PT/16/C/PE/001	ETAR de Alcanide	SIMEIO	33.419.459	30.419.938	91%	30.419.938	18.020.670	8.020.670	80%	8.020.670	88%
2000/PT/16/C/PE/001	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste (1ª etapa do projecto)	Agua do Oeste	25.726.208	20.726.208	80%	19.510.079	16.583.527	15.822.657	64%	15.822.657	90%
2000/PT/16/C/PE/014	Sistema Municipal de Saneamento de Tejo e Trancão	SIMEIO	35.094.400	30.094.400	86%	36.756.866	18.378.483	13.702.559	52%	13.702.559	78%
2003/PT/16/C/PE/001	Sistema Municipal de Saneamento de Alagave	Agua de Alagave	46.998.260	26.319.026	56%	38.303.350	19.769.876	20.662.530	75%	20.662.530	104%
2003/PT/16/C/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Linha - 3ª Fase	Agua do Oeste	3.335.339	2.233.127	67%	1.451.533	1.510.207	1.510.207	100%	1.510.207	104%
2004/PT/16/C/PE/006	Agua do Oeste - 2ª Fase	Agua do Oeste	50.289.999	36.642.142	73%	36.642.142	25.649.499	28.169.014	81%	28.169.014	110%
2004/PT/16/C/PE/009	Sistema Inter municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lousã do Tejo - 1ª Fase	Com. Urbana Lezíria Tejo	41.878.432	28.477.334	68%	9.020.233	6.133.781	5.719.805	22%	5.719.805	93%
2006/PT/16/C/PE/003	S.V. Ave-Alargamento/Estudos/Projectos/Assessorias	Agua Ave	4.304.000	3.655.000	85%	714.469	607.299	911.882	17%	911.882	150%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2000/PT/16/C/PE/009	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Linha - 1ª Fase	Agua do Minho	53.488.905	34.767.788	65%	53.488.905	34.767.788	27.814.231	100%	27.814.231	80%
2001/PT/16/C/PE/002	Infraestruturas para a Gestão Optimizada da Água no Região Autónoma da Madeira - 1ª Fase	Invest. Gestão Agua	39.662.579	29.040.940	73%	37.612.345	27.539.789	23.232.752	95%	23.232.752	84%
2001/PT/16/C/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte Alentejano	Ag. Norte Alentejano	55.136.816	39.698.546	72%	48.668.916	35.041.332	31.758.837	88%	31.758.837	91%
2002/PT/16/C/PE/008	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Linha - 2ª Fase	Agua do Minho	76.752.240	49.888.956	65%	59.472.483	38.652.133	39.911.145	37%	39.911.145	103%
2002/PT/16/C/PE/011	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Alentejo - 2ª Fase	Audentro	49.725.200	49.725.200	100%	44.666.051	31.126.706	32.962.969	63%	32.962.969	106%
2003/PT/16/C/PE/002	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo	Ag. Centro Alentejano	46.493.149	22.816.712	49%	37.019.244	17.769.237	17.818.347	80%	17.818.347	100%
2004/PT/16/C/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Fase I	Agua Ave	78.985.989	42.873.102	54%	56.615.622	30.742.283	27.032.646	88%	27.032.646	88%
2005/PT/16/C/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª Fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338.000	44.887.300	85%	48.473.207	41.202.256	35.889.840	93%	35.889.840	88%
2005/PT/16/C/PE/005	S. Mat. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego Barragem	Agua do Mondego	62.264.151	33.000.000	53%	38.491.967	20.400.742	20.923.152	62%	20.923.152	103%
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>237.195.997</b>	<b>140.228.812</b>	<b>59%</b>	<b>110.276.525</b>	<b>67.802.467</b>	<b>64.800.244</b>	<b>46%</b>	<b>64.800.244</b>	<b>95%</b>
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			<b>222.866.491</b>	<b>156.479.612</b>	<b>70%</b>	<b>190.076.127</b>	<b>117.233.389</b>	<b>125.183.689</b>	<b>85%</b>	<b>125.183.689</b>	<b>93%</b>
<b>AGUAS RESIDUAIS</b>			<b>311.841.413</b>	<b>189.311.840</b>	<b>61%</b>	<b>173.250.830</b>	<b>99.957.307</b>	<b>96.203.055</b>	<b>56%</b>	<b>96.203.055</b>	<b>98%</b>
<b>MULTI-SECTORIAL</b>			<b>536.127.883</b>	<b>345.798.544</b>	<b>64%</b>	<b>424.309.138</b>	<b>277.247.276</b>	<b>257.031.940</b>	<b>79%</b>	<b>257.031.940</b>	<b>93%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			<b>1.307.729.774</b>	<b>831.818.808</b>	<b>64%</b>	<b>897.912.621</b>	<b>579.244.528</b>	<b>545.238.927</b>	<b>69%</b>	<b>545.238.927</b>	<b>94%</b>
<b>ASSISTENCIA TECNICA</b>											
2000/PT/16/C/PE/001	Assistência Técnica ao Fundo de Coesão II	ODDR/GESTIMP/AFCC/IRAM	2.583.311	2.183.314	88%	1.872.782	1.691.868	1.625.271	74%	1.625.271	102%
2003/PT/16/C/PE/001	A.T. Ambiente	MCD/ambiente	2.270.196	1.929.667	85%	1.510.743	1.284.131	1.353.048	67%	1.353.048	103%
<b>SUB-TOTAL ASSISTENCIA TECNICA</b>			<b>4.803.507</b>	<b>4.082.981</b>	<b>85%</b>	<b>3.383.525</b>	<b>2.875.996</b>	<b>2.978.319</b>	<b>70%</b>	<b>2.978.319</b>	<b>104%</b>
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO</b>			<b>2.293.199.506</b>	<b>1.623.340.835</b>	<b>71%</b>	<b>1.507.590.742</b>	<b>1.067.014.160</b>	<b>1.061.262.151</b>	<b>66%</b>	<b>1.061.262.151</b>	<b>99%</b>
<p>** No Total Geral do "Investimento Total Aprovado" (colunas 1 e 2) não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apelo), respectivamente.</p> <p>*** Os Pagamentos ao Executor (coluna 7) incluem, o montante de 1.772.907€ relativos ao projecto 196/PT/16/C/PE/021 da C. M. Vila Real, Sto Antonio que, por lapso da CE foi efectuada na conta do FCII e também a dedução do montante de 6.190.617€ do projecto 200/PT/16/C/PE/002 da Valor Ambiente que, embora tenha dado entrada na conta do FCII diz respeito ao encerramento do compromisso aprovado no FCII.</p> <p>**** A percentagem constante na coluna 8 é inferior a 100%, porque existe uma parte do ND que não se encontra reflectida na despesa validada.</p>											



## 3. Condições de Execução

Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

DECISÕES ANULADAS <sup>(1)</sup>											
Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apelo FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Eligibilidade da Despesa Fim (8)	Encerramento Envio PPSaldo (10)	Taxa de Exec. Final* (12)		
Un.: 1000 Euros											
AMBIENTE											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
2004/PE/010	Valorização de RUB do Alto e Baixo Tâmega, Vale do Douro Sul e Norte	RESAT / REBAT / Residouro / A.M. Vale Douro Norte	8.210,400	4.762,032	58%	27-Dez-04					
2004/PE/015	Valorização de RUB dos Sistemas AMVGRA, AMALGA, AMCAL e AMDE	AMALGA/AMAGRA/AMCAL/AMDE	12.103,200	7.382,952	61%	27-Dez-04					
2004/PE/016	Resíduos do Nordeste - Valorização de Matéria Orgânica	Resíduos do Nordeste	6.383,500	2.936,410	46%	4-Ago-05					
2004/PE/020	Central de Valorização Orgânica do Vale do Sousa	Com. Urbana Vale do Sousa	8.512,250	5.968,574	70%	22-Abr-05					
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>4</b>	<b>35.209,350</b>	<b>21.039,968</b>	<b>60%</b>						
<b>TOTAL DECISÕES ANULADAS</b>		<b>4</b>	<b>35.209,350</b>	<b>21.039,968</b>	<b>60%</b>						
(1) Por desistência do executor, Fundo de Coesão não recuperável											
<b>DECISÕES COM SALDO PAGO</b>											
Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apelo FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Eligibilidade da Despesa Fim (8)	Encerramento Envio PPSaldo (10)	Taxa de Exec. Final* (12)		
Un.: 1000 Euros											
<b>PORTOS</b>											
1997/PT/005	Terminal Multimodal do Porto de Setúbal	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	29.016,961	14.798,650	51%	30-Out-00	20-Nov-97	31-Dez-02	8-Nov-02	5-Mai-03	100%
2000/PT/010	Acessibilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias do Porto de Aveiro	Adm. Porto Aveiro	35.998,387	17.549,193	50%	31-Dez-01	19-Set-00	31-Dez-06	28-Jun-07	12-Dez-07	95%
2003/PT/001	Extensão do Cais do Terminal Ro-Ro do Porto de Setúbal - 1ª fase (estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	320,000	272,000	85%	19-Set-03	7-Abr-03	31-Dez-06	28-Jun-07	11-Dez-08	53%
2003/PT/005	Recuperação do Terminal Eurominas - 1ª fase (estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	480,000	408,000	85%	1-Dez-03	10-Jun-03	31-Dez-06	28-Jun-07	9-Fev-09	70%
2003/PT/006	Reabilitação do Porto de S. Roque do Pico	Adm. Portos Triang. Gr. Ocidental	7.637,210	6.491,628	85%	22-Out-03	10-Jun-03	31-Mai-07	28-Set-07	7-Nov-08	100%
<b>RODOVIA</b>											
2000/PT/005	IP2 - Lanço entre a EN 216 e a EN 102	Inst. Est. Portugal	14.148,542	12.026,261	85%	15-Jun-01	1-Fev-00	31-Dez-02	27-Jun-03	7-Out-03	100%
2000/PT/006	Interligação IP3 - IP5	Inst. Est. Portugal	23.401,331	19.891,131	85%	22-Mai-01	1-Fev-00	31-Dez-02	27-Jun-03	17-Out-03	84%
2000/PT/007	IP 6 - Lanço Abrantes/Mouriscas	Inst. Est. Portugal	12.168,274	10.343,033	85%	29-Dez-00	1-Fev-00	31-Dez-02	27-Jun-03	17-Out-03	89%
2000/PT/008	IP3 - Variante de Castro Daire - Túnel de Castro Daire	Inst. Est. Portugal	14.398,544	12.238,762	85%	29-Dez-00	1-Fev-00	30-Jun-04	28-Jun-04	10-Ago-05	100%
2002/PT/001	IP6 - Peniche/IC1	Inst. Est. Portugal	58.948,073	49.340,862	85%	30-Dez-02	28-Jun-02	30-Dez-06	28-Jun-07	6-Nov-07	100%
2004/PT/003	Ligação de Torre de Monconvo ao IP2	Inst. Est. Portugal	11.758,879	9.995,047	85%	14-Dez-04	10-Ago-04	31-Dez-06	28-Jun-07	26-Fev-08	100%
<b>FERROVIA</b>											
2000/PT/003	Modernização Lig. ao Algarve II - Remodelação dos Sub-troços P. Novo-Poeirão-Pineiro - Grandola-Ermidas e Linha de Sines	REFER	113.379,290	90.703,432	80%	29-Dez-00	1-Fev-00	31-Jul-05	30-Jan-06	09-Jun-06	97%
2001/PT/001	Modernização Lig. ao Algarve IV - Remodelação do Subtroço Pinheiro - PK 94	REFER	9.284,578	7.427,662	80%	13-Dez-01	13-Jun-01	31-Dez-03	29-Jun-04	3-Dez-04	100%
2001/PT/003	Modernização Lig. ao Algarve V - Remodelação do Subtroço Ermidas - Faro	REFER	173.996,419	139.197,136	80%	13-Dez-01	5-Jul-01	31-Dez-07	30-Jun-08	19-Fev-09	97%
2003/PT/004	Modernização Linha do Minho - Remodelação do Subtroço Loussado-Nine	REFER	73.077,814	39.462,020	54%	19-Nov-03	10-Jun-03	31-Dez-07	30-Jun-08	17-Fev-09	95%
<b>AEROPORTO</b>											
2003/PT/011	Requalificação e Modernização do Aerogare Civil das Lajes	SRE - Dir. Reg. Transportes Comunicações	17.948,598	13.820,420	77%	19-Fev-04	7-Out-03	30-Jun-06	31-Dez-08	9-Dez-09	96%
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>3</b>	<b>72.552,568</b>	<b>39.519,471</b>	<b>54%</b>						<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>1</b>	<b>133.923,643</b>	<b>113.835,096</b>	<b>85%</b>						<b>96%</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>1</b>	<b>369.738,101</b>	<b>276.790,250</b>	<b>75%</b>						<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL AEROPORTO</b>		<b>1</b>	<b>17.948,598</b>	<b>13.820,420</b>	<b>77%</b>						<b>96%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>6</b>	<b>594.162,900</b>	<b>443.965,237</b>	<b>75%</b>						<b>97%</b>



Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

Un.: 1000 Euros

Codigo (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apoio Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Elegibilidade da Despesa (8)		Encerramento Envio PPSaldo (10)	Pagam. Saldo (11)	Taxa de Exec. Final* (12)
							Início (8)	Fim (9)			
<b>AMBIENTE</b>											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
1997/PE/015	Sistema Mult. Tratamento de RSU do Oeste - 2ª fase	RESIDESTE	20.574,180	17.488,053	85%	5-Set-01	1-Jul-97	31-Dez-02	27-Jun-03	7-Out-03	100%
2000/PE/003	Aterro Sanitário da LIPOR	LIPOR	7.763,889	3.881,945	50%	29-Dez-00	24-Fev-00	28-Fev-02	26-Ago-02	25-Set-02	100%
2000/PE/011	Sist. Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Baixo Tâmega	REBAT	14.624,096	12.430,482	85%	29-Dez-00	5-Out-00	31-Dez-04	27-Jun-05	17-Jun-09	97%
2000/PE/012	Sist. Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Alto Tâmega	RESAT	13.522,161	11.493,837	85%	15-Jan-01	5-Out-00	31-Dez-04	29-Jun-04	3-Set-04	100%
2000/PE/013	Sistema Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Norte Alentejano	EGF / VALINOR	12.643,600	10.747,060	85%	15-Jan-01	5-Out-00	31-Dez-07	30-Jun-08	5-Nov-09	97%
2001/PE/001	Sistema de Tratamento de RSU do Baixo Alentejo	ANALGA	17.710,801	13.938,600	79%	31-Out-01	5-Fev-01	31-Jan-06	25-Jul-06	12-Mai-08	82%
2001/PE/003	Ações Complementares de Tratamento de RSU	EGF	18.150,000	13.594,350	75%	31-Dez-01	28-Jun-01	31-Dez-04	28-Jun-05	31-Mar-06 17-Jun-08	100%
<b>ABASTECIMENTO de ÁGUA</b>											
1999/PE/001	Abastecimento de Água ao Grande Porto Sul - Alargamento ao Vale de Sousa	Águas Douro e Paiva	49.879,789	42.397,820	85%	27-Out-00	18-Mai-99	31-Dez-04	28-Jun-05	29-Jan-07	100%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
1996/PE/003	Colecta e Tratamento de Efluentes Líquidos da Ria de Aveiro - 2ª fase (Dec.Conj. c/ 1ª fase)	SIMRIA	50.006,727	42.505,719	85%	12-Dez-00	11-Jan-96 e 21-Jan-99	31-Dez-04	28-Jun-05	1-Ago-06	100%
2000/PE/004	ETAR de Sobreiras	C. M do Porto	32.692,032	10.232,606	31%	14-Mai-01	24-Fev-00	30-Jun-04	16-Dez-04	15-Mai-09	92%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2002/PE/009	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - Est./Proj./Ass.	Águas do Ave	3.140,000	2.669,000	85%	9-Jul-03	28-Jun-02	31-Dez-06	28-Jun-07	5-Ago-08	99%
<b>EDIA</b>											
1994/PE/028	Central Hidroelétrica do Alqueva - 2ª fase (proj. aprovado em %)	EDIA	62.151,158	34.338,515	55%	93-99	93-99	31-Dez-04	7-Set-07	7-Dez-07	95%
<b>SUB-TOTAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
			7	104.988,727	83.574,127	80%					96%
<b>SUB-TOTAL ABASTECIMENTO de ÁGUA</b>											
			1	49.879,789	42.397,820	85%					100%
<b>SUB-TOTAL ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
			2	82.698,759	52.738,325	64%					97%
<b>SUB-TOTAL MULTI-SECTORIAL</b>											
			1	3.140,000	2.669,000	85%					99%
<b>SUB-TOTAL EDIA</b>											
			1	62.151,158	34.338,515	55%					95%
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			12	302.858,433	215.717,787	71%					97%
<b>TOTAL COM SALDO PAGO</b>			18	897.021,333	659.683,024	74%					97%



Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

**DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO**

Un.: 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprobado (4)	Apoio Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6) = (5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Elegibilidade da Despesa Início (8)	Fim (9)	Envio PPSaldo (10)	Encerramento Montante (11)	Taxa de Exec. Final* (12)
<b>TRANSPORTES</b>											
<b>PORTOS</b>											
2003/PT/003	Porto de Cantale	Adm. Portos da RAM	71.360,733	41.389,225	58%	21-Nov-03	3-Jun-03	30-Dec-03	30-Jun-09	7.261,125	100%
2003/PT/010	Req. Porto Praia Vitória	Adm. Portos Terceira e Graciosa	33.047,102	27.429,095	83%	18-Dec-03	7-Out-03	31-Dec-08	30-Jun-09	5.239,658	99%
2005/PT/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	Adm. Portos Ilhas S.Maria e S.Miguel	32.189,043	24.141,782	75%	19-Dec-05	4-Ago-05	31-Jan-09	20-Jul-09	4.711,299	100%
<b>RODOVIA</b>											
2003/PT/007	Eixo Viário Norte / Sul	Inst. Est. Portugal	47.300,650	40.205,553	85%	22-Dec-03	18-Jul-03	30-Abr-09	28-Out-09	1.918,107	85%
2005/PT/002	IC3 - Ligação de Tomar ao IP6	Inst. Est. Portugal	17.793,485	14.946,527	84%	9-Dec-05	4-Ago-05	31-Jan-09	30-Jun-09	1.568,442	90%
2006/PT/002	Ponte Intermodal de Quintanilha e Azeitos	Inst. Est. Portugal	14.231,702	11.669,996	82%	8-Dec-06	1-Ago-06	31-Mar-09	30-Set-09	1.267,654	91%
<b>FERROVIA</b>											
2000/PT/012	Modernização Lq. ao Algarve III - Subtroço Coima-Pinnal Novo	REFER	107.698,395	86.158,716	80%	29-Dec-00	18-Out-00	31-Dec-05	28-Jun-07	10.628,769	94%
2000/PT/013	Ligação a Linha do Norte - Subt. Entreampós (excl) - Term. Chelas (excl)	REFER	49.004,255	39.203,404	80%	29-Dec-00	26-Out-00	30-Dec-04	28-Jun-05	5.155,236	93%
2003/PT/008	Modernização Linha do Minho - Remodelação do Subtroço Nisa-Braga	REFER	77.777,150	47.444,062	61%	27-Fev-04	22-Jul-03	31-Dec-07	30-Jun-08	2.522,466	77%
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>3</b>	<b>136.596,878</b>	<b>92.960,102</b>	<b>68%</b>						<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>1</b>	<b>79.325,837</b>	<b>66.822,076</b>	<b>84%</b>						<b>87%</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>1</b>	<b>234.479,800</b>	<b>172.806,182</b>	<b>74%</b>						<b>88%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>5</b>	<b>450.402,515</b>	<b>332.588,360</b>	<b>74%</b>						<b>91%</b>



### Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

#### DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO (cont.)

Un.: 1.000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprobado (4)	Apoio Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Elegibilidade da Despesa Início (8)	Fim (9)	Encerramento Envio PPSaldo (10)	Montante (11)	Taxa de Exec. Final* (12)
	<b>AMBIENTE</b>										
	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1998/PE/001	Tratamento e Destino Final de RSU Ilhas S. Miguel, Pico e Terceira - RAA	DREPA	22.337,290	18.986,696	85%	29-Dez-00	19-Mai-98	31-Dez-07	30-Jun-08	2.305,817	92%
1999/PE/005	Central de Valorização Orgânica da VALORSUL (CVO)	VALORSUL	20.750,000	10.375,000	50%	29-Dez-00	10-Ago-99	31-Dez-05	28-Jun-06	772,724	87%
2000/PE/002	RSU da Ilha da Madeira - 2ª fase	Valor Ambiente	107.624,794	71.871,837	67%	19-Jul-02	21-Mai-96	30-Jun-09	30-Dez-09	10.209,934	99%
2000/PE/015	Sistema de Tratamento de RSU da Cova da Beira	Ag. Zêzere e Cova	14.791,616	12.572,874	85%	14-Dez-01	26-Out-00	31-Dez-06	28-Jun-07	1.217,955	85%
	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
1999/PE/006	Abast. Água Planalto Beirão	AM Planalto Beirão	28.219,304	22.575,443	80%	8-Dez-03	10-Ago-99	31-Dez-08	30-Jun-09	3.799,058	97%
	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
2000/PE/008	Despoluição Integrada das Bacias do Rio Lis e da Ribeira do Selga - 2ª fase	SIMLIS	41.213,631	32.970,825	80%	29-Dez-00	19-Set-00	30-Jun-08	31-Dez-08	6.594,165	100%
2002/PE/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projectos/Assessorias	Águas do Algarve	2.484,916	2.112,179	85%	3-Jul-02	15-Abr-02	31-Dez-08	30-Jun-09	587,389	86%
2002/PE/005	Saneamento do Concelho de Braga	AGERE	25.844,335	16.747,129	65%	27-Dez-02	15-Abr-02	30-Jun-09	30-Dez-09	3.349,426	100%
2002/PE/007	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204,474	56.273,803	85%	3-Dez-03	15-Abr-02	31-Dez-07	30-Jun-08	11.254,761	100%
	<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2000/PE/007	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Cova - 1ª fase	Águas Zêzere e Cova	54.910,000	34.593,300	63%	13-Dez-01	19-Set-00	31-Dez-07	30-Jun-08	6.918,660	96%
2000/PE/010	Estudos, Projectos e Assessorias - 1ª fase	ADP e várias associadas	34.117,770	29.000,104	85%	13-Dez-01	19-Jun-00 e 05-Out-00	31-Mai-07	30-Set-07	4.441,148	95%
2001/PE/007	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Raia Zêzere e Nabão - 1ª fase	Águas do Centro	63.695,000	44.586,500	70%	13-Dez-01	31-Ago-01	31-Dez-07	30-Jun-08	8.917,300	98%
2003/PE/003	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724,941	43.116,200	85%	19-Dez-03	27-Ago-03	30-Jun-08	31-Dez-08	8.623,24	100%
<b>SUB-TOTAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		<b>4</b>	<b>165.503,700</b>	<b>113.806,407</b>	<b>69%</b>						<b>95%</b>
<b>SUB-TOTAL ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>1</b>	<b>28.219,304</b>	<b>22.575,443</b>	<b>80%</b>						<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL ÁGUAS RESIDUAIS</b>		<b>4</b>	<b>135.747,256</b>	<b>108.103,936</b>	<b>80%</b>						<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL MULTI-SECTORIAL</b>		<b>4</b>	<b>203.447,711</b>	<b>151.296,104</b>	<b>74%</b>						<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>		<b>11</b>	<b>532.917,971</b>	<b>395.781,890</b>	<b>74%</b>						<b>97%</b>
<b>TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO</b>		<b>16</b>	<b>983.320,486</b>	<b>728.370,249</b>	<b>74%</b>						<b>95%</b>

Nota explicativa: o totalizador da coluna 'Executor' não corresponde à soma das parcelas quando há executores com projectos aprovados em mais do que um sub-sector.

\* Taxa de execução final abaixo de 100%, despesa certificada abaixo da aprovada, pode resultar do nível de despesa executada ou de restrições sobre a sua certificação.



Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa

Un. 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apóio Total FC (5)	Taxa Apóio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa execução validação (8)	Elegibilidade da Despesa		Envio da Proposta de Reprogramação à CE (12)	
								Início (9)	Conclusão Em vigor (10)		
<b>DECI SÕES COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE</b>											
<b>TRANSPORTES</b>											
<b>PORTOS</b>											
2006/PT/001	Desenvolvimento das Infra-estruturas Portuárias da RAM - Porto do Funchal	Adm. Portos da RAM	23.450.644	14.755.145	63%	20-Dez-06	20%	15-Jun-06	31-Dez-09	31-Dez-10	18-09-09
<b>FERROVIA</b>											
2003/PT/002	Modernização Linha do Sul - Remodelação Subtiroço Pinhal Novo-Setúbal Mbr	REFER	70.790.632	56.632.505	80%	29-Out-03	48%	16-Mai-03	31-Dez-09	31-Dez-10	22-12-2009
SUB-TOTAL	PORTOS	1	23.450.644	14.755.145	63%		20%				
SUB-TOTAL	FERROVIA	1	70.790.632	56.632.505	80%		48%				
SUB-TOTAL	TRANSPORTES	2	94.241.276	71.387.650	76%		41%				
<b>AMBIENTE</b>											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
2002/PE/006	Sistema Inter municipal de RSU do Vale do Ave - 3ª fase	Ass. Munic. Vale do Ave	17.356.026	14.068.381	81%	27-Dez-02	49%	15-Abr-02	30-Jun-09	31-Dez-10	29-06-09
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
2006/PE/002	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 4ª Fase	Águas Minho-Lima	28.578.000	24.291.300	85%	8-Dez-06	35%	1-Ago-06	31-Dez-09	31-Dez-10	23-12-2009
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
2003/PE/005	(a) Sist. Mult. Saneamento da Ria de Aveiro - Barrinha de Esmoniz	SIMRIA	23.020.923	13.582.344	59%	19-Dez-03	78%	27-Ago-03	31-Dez-10		28-12-2009
2004/PE/003	Sist. Mult. Saneamento da Ria de Aveiro - Cérzima e Leifra - 1ª Fase	SIMRIA	12.352.923	5.929.403	48%	30-Nov-04	49%	23-Jun-04	31-Dez-10	31-Dez-10	25-11-2009
2004/PE/021	Interceptores e ETAR da Bacia do Douro - Santa Maria da Feira	C. M. Santa Maria da Feira	16.882.171	11.142.233	66%	13-Dez-05	30%	19-Out-04	31-Dez-08	31-Dez-10	De 24-11-2008 a 29-11-2009
2005/PE/002	(a) Sist. Integrado Mult. de Águas Residuais da Península de Setúbal	SIMARSUL	72.953.200	47.419.580	65%	9-Dez-05	49%	25-Fev-05	31-Dez-08	31-Dez-10	De 13-10-2006 a 03-11-2009
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2002/PE/010	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Còa - 2ª fase	Águas Zêzere e Còa	51.736.003	32.593.682	63%	26-Ser-03	70%	1-Jul-02	31-Dez-09	31-Dez-10	23-12-2009
2005/PE/001	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Còa - Alargamento ao Mondego Superior-Sul	Águas Zêzere e Còa	42.458.946	28.022.904	66%	8-Dez-05	59%	25-Fev-05	31-Dez-08	31-Dez-10	De 31-12-2008 a 31-08-2009
2005/PE/005	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase	Águas do Ave	63.825.212	33.827.362	53%	7-Dez-05	49%	4-Ago-05	31-Dez-08	31-Dez-10	De 30-12-2008 a 24-11-2009
SUB-TOTAL	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1	17.356.026	14.058.381	81%		49%				
SUB-TOTAL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	28.578.000	24.291.300	85%		35%				
SUB-TOTAL	ÁGUAS RESIDUAIS	3	125.209.217	78.073.560	62%		52%				
SUB-TOTAL	MULTI-SECTORIAL	2	158.020.161	94.443.948	60%		59%				
SUB-TOTAL	AMBIENTE	7	329.163.404	210.867.189	64%		54%				
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>											
2004/PA/001	Assistência Técnica ao FCII - 2ª fase	DGDR/FDR	2.864.976	2.435.230	85%	18-Abr-05	55%	16-Nov-04	31-Dez-09	31-Dez-11	15-12-2009
SUB-TOTAL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1	2.864.976	2.435.230	85%		55%				
TOTAL	COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE	10	426.269.656	284.690.069	67%		51%				



Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa

## DECISÕES EM EXECUÇÃO

Un.: 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apelo FC (6) = (5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa execução validação (8)	Elegibilidade da Despesa Início (9)	Fim (10)
<b>TRANSPORTES</b>									
<b>FERROVIA</b>									
2000/PT/001	Modernização da Linha do Norte V - Remod. Subtróço Entroncamento(excl) - Albergaria(excl)	REFER	142.084,956	113.667,965	80%	29-Dez-00	89%	5-Jan-00	31-Dez-10
2000/PT/002	Modernização da Linha do Norte VI - Remod. Subtróço Quintans (excl) - Ovar (excl)	REFER	125.699,556	100.559,645	80%	26-Mai-01	87%	5-Jan-00	31-Dez-10
2000/PT/009	Metro de Lisboa - Baixa - Chiado / Santa Apolónia	Metropolitano de Lisboa	126.383,400	107.425,890	85%	29-Dez-00	97%	19-Abr-00	31-Dez-10
2001/PT/002	Metro de Lisboa - Extensão para Ligação à RTE-T - Lig. S. Sebastião/Alameda/GIL	Metropolitano de Lisboa	132.102,000	98.019,684	74%	18-Dez-01	42%	6-Jun-01	31-Dez-10
2003/PT/012	Metro do Porto - Ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro à Linha Duplicada da Póvoa	Metro do Porto	90.242,537	67.681,903	75%	24-Mai-04	71%	6-Out-03	31-Dez-10
2004/PT/001	Metro de Lisboa - Prolongamento da Linha Vermelha - Oriente/Aeroporto	Metropolitano de Lisboa	175.218,776	148.935,959	85%	22-Dez-04	2%	10-Ago-04	31-Dez-10
2004/PT/002	Modernização da Linha do Norte VII - Remod. entre Vila Franca e Vale de Santarém	REFER	188.935,000	151.148,000	80%	17-Dez-04	66%	10-Ago-04	31-Dez-10
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>3</b>	<b>980.666,225</b>	<b>787.439,046</b>	<b>80%</b>		<b>62%</b>		
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>3</b>	<b>980.666,225</b>	<b>787.439,046</b>	<b>80%</b>		<b>62%</b>		
<b>AMBIENTE</b>									
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>									
2002/PE/002	Gestão Integrada de RSU da LIPOR - Central de Valorização Orgânica	LIPOR	53.515,700	26.597,303	50%	19-Dez-02	84%	21-Fev-02	31-Mar-10
2004/PE/002	Sistema Inter municipal RSU do Planalto Beirão - CVO	Ass. Munic. Planalto Beirão	34.372,766	25.779,575	75%	27-Dez-04	84%	9-Jun-04	31-Jan-10
2004/PE/007	Unidade de Digestão Anaeróbia para tratamento de RUB de Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra	Tratolixo	43.880,000	25.450,400	58%	23-Dez-04	27%	3-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/011	Valorização de RUB da Cova da Beira, Norte Alentejano e Raia Pnmal	Valnor	8.785,000	6.500,900	74%	22-Abr-05	100%	14-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/012	Valorização de RUB no Sistema IMIT. de RSU da Margem Sul do Tejo	AMARSUL	40.309,982	23.782,889	59%	14-Dez-04	18%	14-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/013	Valorização Matéria Orgânica no Sistema IMIT. Vila Nova Gaia e Sta Maria Feira	SULDOURO	9.048,000	5.971,680	66%	4-Ago-05	0,05%	14-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/014	Valorização Orgânica de Resíduos - Ecomarque Braval	Braval	8.348,000	5.760,120	69%	22-Abr-05	0,04%	21-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/017	Valorização Orgânica no Sistema Multimunicipal do Algarve	ALGAR	10.207,763	7.451,667	73%	27-Dez-04	27%	21-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/018	Valorização Orgânica de RUB dos Sistemas Multimunicipais da Valorsis e da Resioeste	VALORSIS	9.826,775	7.075,278	72%	22-Abr-05	58%	21-Set-04	31-Dez-10
2004/PE/019	Valorização de RUB da Resitejo, Resiurb e Amartejo	Resitejo	18.900,000	5.859,000	31%	22-Abr-05	1%	28-Set-04	31-Dez-10
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
2000/PE/006 (a)	Sist. Multim. Abast. Água Barlav./Soav. - Alargamento, Optimização e Interligação	Águas do Algarve	23.640,038	11.820,019	50%	29-Dez-00	100%	29-Jun-00	31-Dez-09
2004/PE/005	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646,468	49.849,498	85%	14-Dez-04	98%	12-Jul-04	31-Dez-09
2004/PE/008 (a)	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Oeste - 3ª fase (abastecimento)	Águas do Oeste	67.377,283	37.057,505	55%	14-Dez-04	77%	14-Set-04	31-Dez-10
2005/PE/007	Gestão Optimizada da Água na RAMI - 2ª fase	Invest. Gestão Água	19.270,000	14.067,100	73%	6-Mar-06	81%	15-Set-05	31-Dez-10
2006/PE/001	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932,703	43.685,490	81%	8-Dez-06	78%	1-Ago-06	31-Dez-10
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>									
1996/PE/021	Interceptores e Tratamento Águas Residuais de V. R. Santo António	Águas do Algarve/GM.V.R. Santo António	7.515,666	6.388,316	85%	22-Mai-01	35%	19-Set-96	31-Dez-10
1998/PE/002	Adaptação e Completamento da Etar de Alcântara	SIMTEJO	33.419,459	10.025,838	30%	21-Mai-01	91%	11-Set-98	31-Dez-10
2000/PE/001 (a)	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Oeste - 1ª fase	Águas do Oeste	30.266,469	25.726,498	85%	25-Ago-03	64%	27-Jun-02	30-Jun-10
2000/PE/014 (a)	Sist. Mult. Saneamento do Tejo - Trancão	SIMTEJO	70.188,980	35.094,490	50%	5-Ago-03	52%	26-Out-00	31-Dez-10
2003/PE/001 (a)	Sist. Mult. Saneamento do Algarve - 1ª fase	Águas do Algarve	46.998,260	26.319,026	56%	18-Dez-03	75%	28-Jul-03	31-Dez-10
2003/PE/004 (a)	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Minho Lima - 3ª fase	Águas Minho Lima	5.131,291	3.335,339	65%	1-Dez-03	44%	27-Ago-03	31-Dez-10
2004/PE/006	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Oeste - 2ª fase	Águas do Oeste	71.842,856	50.289,999	70%	30-Nov-04	51%	10-Ago-04	31-Dez-10
2004/PE/009	Sist. Inter municipal Abastecimento Água e Saneamento da Lezíria do Tejo	Com. Urbana Lezíria do Tejo	41.878,432	28.477,334	68%	23-Dez-04	22%	14-Set-04	31-Dez-10
2006/PE/003	Sist. Multimunicipal de Abast. de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Estudos/Projectos/Assessorias - Alargamento	Águas do Ave	4.300,000	3.655,000	85%	8-Dez-06	17%	1-Ago-06	31-Dez-10



### Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa

#### DECISÕES EM EXECUÇÃO (cont.)

Un.: 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apoio Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa execução validação (8)	Elegibilidade da Despesa	
								Início (9)	Fim (10)
<b>MULTI-SECTORIAL</b>									
2000/PE/009	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Minho Lima - 1ª fase	Águas Minho Lima	53.488,905	34.767,788	65%	27-Dez-01	100%	19-Set-00	30-Jul-09
2001/PE/002	(a) Gestão Optimizada da Água na RAM - 1ª fase	Invest. Gestão Água	39.662,579	29.040,940	73%	18-Dez-01	95%	30-Abr-01	30-Jun-10
2001/PE/004	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Norte Alentejano	Ág. Norte Alentejano	55.136,870	39.698,546	72%	20-Out-03	88%	28-Jul-02	31-Dez-10
2002/PE/008	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Minho Lima - 2ª fase	Águas Minho Lima	76.752,240	49.888,956	65%	5-Set-03	77%	13-Jun-02	31-Dez-10
2002/PE/011	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Raia Zézeze e Nabão - 2ª fase	Águas do Centro	71.036,000	49.725,200	70%	27-Jun-03	63%	1-Jul-02	31-Dez-10
2003/PE/002	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Centro Alentejo	Ág. Centro Alentejo	46.493,149	22.316,712	48%	28-Nov-03	80%	8-Set-03	31-Dez-10
2004/PE/004	(a) Sist. Multimunicipal de Abast. de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 1ª fase	Águas do Ave	78.955,989	42.873,102	54%	27-Dez-04	72%	23-Jun-04	31-Dez-10
2005/PE/004	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338,000	44.487,300	85%	22-Dez-05	93%	27-Mai-05	31-Dez-10
2005/PE/006	(a) Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Baixo Mondego - Bairrada	Águas do Mondego	62.264,151	33.000,000	53%	6-Dez-05	62%	4-Ago-05	31-Dez-10
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>10</b>	<b>237.193,986</b>	<b>140.228,812</b>	<b>59%</b>		<b>46%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO de ÁGUA</b>	<b>4</b>	<b>222.866,492</b>	<b>156.479,612</b>	<b>70%</b>		<b>85%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>	<b>7</b>	<b>311.541,413</b>	<b>189.311,840</b>	<b>61%</b>		<b>56%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	<b>8</b>	<b>536.127,883</b>	<b>345.798,544</b>	<b>64%</b>		<b>79%</b>		
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>		<b>22</b>	<b>1.307.729,774</b>	<b>831.818,808</b>	<b>64%</b>		<b>69%</b>		
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>									
2000/PA/001	(a) Assistência Técnica ao FCII	DGDR/GSTransp./1 GFC-RAM	2.633,311	2.153,314	85%	24-Jan-01	74%	5-Out-00	31-Dez-10
2003/PA/001	Assistência Técnica no domínio do Ambiente	MCOTAmbiente	2.270,196	1.929,667	85%	16-Out-03	67%	7-Abr-03	31-Dez-11
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>		<b>2</b>	<b>4.803,507</b>	<b>4.082,981</b>	<b>85%</b>		<b>70%</b>		
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO</b>		<b>27</b>	<b>2.293.199,506</b>	<b>1.623.340,835</b>	<b>71%</b>		<b>66%</b>		
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO COM OU SEM REPROGRAMAÇÃO</b>		<b>33</b>	<b>2.719.469,162</b>	<b>1.908.030,904</b>	<b>70%</b>		<b>63%</b>		

Nota explicativa: o totalizador da coluna "Executor" não corresponde à soma das parcelas quando há executores com projectos aprovados em mais do que um sub-sector.



#### 4. Quadros Síntese

**Quadro 8.** Número de Executores, Decisões de Aprovação e Montantes Aprovados por Sub-setores

Sector e sub-setores	Número de Executores*	Número de Decisões de Aprovação	Investimento Total Aprovado**	Apoio Total Aprovado**	Unid: Euros
					Taxa Média Apoio
Total Portos	6	9	232.600.080	147.234.718	63%
Total Rodovia	1	9	213.249.480	180.657.172	85%
Total Ferrovia	3	15	1.655.674.758	1.293.667.982	78%
Total Aeroporto	1	1	17.948.598	13.820.420	77%
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>
Total Resíduos Sólidos	18	22	525.042.440	351.667.727	67%
Total Abastecimento de Água	7	8	329.543.584	245.744.175	75%
Total Águas Residuais	14	19	655.196.645	428.227.661	65%
Total Multi-Sectorial	10	17	900.735.755	594.207.596	66%
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	1	1	62.151.158	34.338.515	55%
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>39</b>	<b>67</b>	<b>2.472.669.582</b>	<b>1.654.185.673</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7.668.483</b>	<b>6.518.211</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53</b>	<b>104</b>	<b>4.599.810.981</b>	<b>3.296.084.176</b>	<b>72%</b>

\* No número de executores, o Total Ambiente e o Total Geral não correspondem à soma das parcelas porque há executores com Decisões Aprovadas em mais do que um sub-sector.

\*\* No Total Geral do 'Investimento Total Aprovado' e 'Apoio Total Aprovado' não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apoio), respectivamente.

NOTA: No Total de Decisões não estão incluídos as 4 Decisões anuladas no âmbito dos Resíduos Sólidos.

**Quadro 9.** Evolução anual Despesa Certificada e Transferências Financeiras

	Unid: Milhares de Euros				
	Ano 2006	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009	2000-2009
Despesa Fundo Validada	303.688	306.535	341.560	304.391	2.539.185
Pagamentos aos Executores	286.279	344.286	230.815	276.542	2.423.467
Transferências da CE	187.526	425.793	182.802	313.581	2.510.774
Despesa Fundo Certificada*	248.227	478.614	286.092	325.173	2.362.209

\* Os montantes de despesa certificada para os projectos 2000/PT/16/C/PE/003, 1996/PT/16/C/PE/003, 2000/PT/16/C/PE/008, 2003/PT/16/C/PE/003, 2002/PT/16/C/PE/005 e 2000/PT/16/C/PE/002 são apresentados até ao limite aprovado, apesar do montante total certificado ter sido superior.

**Quadro 10.** Despesa Validada e a Validar

	Unid: Euros							
	Inv. Aprovado*		Inv. Aprovado com Quebras		Despesa Validada		Despesa por validar	
	Total (1)	Fundo (2)	Total (3)	Fundo (4)	Total (5)	Fundo (6)	Total (7)=(1)-(5)	Fundo (8)=(2)-(6)
Transportes	2.119.472.916	1.635.380.292	2.060.398.258	1.592.299.823	1.630.789.721	1.248.764.855	429.966.766	343.821.551
Ambiente	2.472.669.582	1.654.185.673	2.447.558.771	1.637.272.794	1.885.835.215	1.286.210.525	562.639.350	351.782.998
Assistência Técnica	7.668.483	6.518.211	7.668.483	6.518.211	4.952.300	4.209.455	2.716.183	2.308.756
<b>TOTAL</b>	<b>4.599.810.981</b>	<b>3.296.084.176</b>	<b>4.515.625.512</b>	<b>3.236.090.828</b>	<b>3.521.577.236</b>	<b>2.539.184.835</b>	<b>995.322.299</b>	<b>697.913.305</b>

\* No Total do 'Invest. Aprovado' nas colunas 1 e 2 não estão incluídos os Projectos Anulados, nos montantes de 35.209.350€ (inv. total) e 21.039.968€ (apoio), respectivamente.
